

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : N°53 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Référence client : BVIL-MI\_BVIL-MI-53V\_007587

Désignation : Autres Privatif

Date de construction : Avant 2020

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUPETIT MATHIS

Accompagnateur : GUILLOU MELVIL (0 800 400 100)

Date de repérage : 07/12/2023

Numéro attestation : CPDI6337

Délivré le : 12/04/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :  
Société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE  
33 Rue du Faubourg de Bourgogne - CS 51557  
45000 ORLEANS

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - logement 53 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	RDC - logement 53 - Vol 2 (Parking couvert privatif)
RDC - logement 53 - Vol 3 (Autre local privatif)	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)
RDC - logement 53 - Vol 5 (WC)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)
RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)
R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)	R+1 - logement 53 - Vol 10 (Autre local privatif)
R+1 - logement 53 - Vol 11 (Chambre 1)	R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)
R+1 - logement 53 - Vol 13 (Autre local privatif)	

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

#### TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- o Reprise isolation thermique par l'intérieur (uniquement MI à Etage types 2 et 3: Rampant, bas de rampant et plancher bas de rampant)
- o Remplacement de l'installation de ventilation par une VMC simple flux hygro B (toutes les MI)
- o Mise en place de pompe à chaleur Air-Air (toutes les MI)

#### TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉS

- o Reprise de seuil (uniquement les MI de plain-pied Type 1)
- o Remplacement de porte d'entrée (uniquement les MI de plain-pied Type 1)

#### TRAVAUX STRUCTURELS

- o Renforcement du plancher haut RdC (uniquement sur 8 MI)

#### TRAVAUX DE CONFORT/QUALITÉ

- o Reprise de plâtrerie et de menuiserie intérieure suite reprise structurelle
- o Remplacement de revêtement de sol suite reprise structurelle
- o Mise en peinture suite reprise structurelle
- o Dépose / repose de porte de garage
- o Révision de la couverture et démoussage
- o Remplacement des dessous de toiture
- o Révision et mise en peinture des boiserie extérieures (Volets et chiens assis)
- o Reprise d'une terrasse (uniquement 1 MI)
- o Modification réseau/fourreau pour raccordement fibre optique

En résumé, les travaux impacteront l'ensemble des éléments extérieurs ainsi que l'intérieur (murs et du sol au plafond,...).

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

le périmètre concerne le logement et son extérieur

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

## D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

## D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC - logement 53	Vol 1 (Espace extérieur privatif)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - logement 53	Vol 2 (Parking couvert privatif) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de sol	RDC - logement 53	Vol 2 (Parking couvert privatif) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	RDC - logement 53	Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (WC) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	RDC - logement 53	Vol 6 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - logement 53	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 - logement 53	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de sol	R+1 - logement 53	Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Salle de bains) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 13 (Autre local privatif)	
Revêtement de mur	R+1 - logement 53	Vol 9 (Salle de bains)	
Toiture et étanchéité	R+1 - logement 53	Vol 12 (Chambre 2)	

**D-6** MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

### E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P9
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P9
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P9
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685903 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER685903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

**R+1 - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Rouge	002ER68 5903 n°4 - 1	P4	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Rouge	002ER68 5903 n°4 - 1	P4	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER685903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER685903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER68 5903 n °12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER68 5903 n °12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER685903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement) - Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 12 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER685903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Dégagement) - Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1) - Vol 10 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44 -	Sondage et		002ER68	P13	Peintures	Négatif	Négatif sur analyse
				S45 -	extension de la		5903 n		multiples non		
				S46 -	ZPSO du		°13 - 1		séparable +		
				S47 -	prélèvement P13				matériau plâtreux		
				S48 -					blanc non		
				S49 -					séparable +		
				S50 -					papier non		
				S51 -					séparable +		
				S52 -					enduit plâtreux		
				S53 -					blanc avec		
				S54 -					couche		
				S55 -					cartonnée non		
				S56 -					séparable		
				S57 -							
				S58 -							
				S59 -							
				S60 -							
				S61 -							
				S62 -							
				S63 -							
				S64 -							
				S65 -							
				S66 -							
				S67 -							
				S68 -							
				S69							
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5903 n °17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002ER68 5903 n °17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse


**R+1 - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 1	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 2	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 2	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 2	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 2	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 3	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 3	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse


**R+1 - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 3	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Blanc	002ER68 5903 n °18 - 1	P18 Phase 3	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002ER68 5903 n °19 - 1	P19	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré	Positif	Présence sur analyse
Vol 10 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S75 (P19)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Jaune	002ER68 5903 n °19 - 1	P19	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré	Positif	Présence sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5903 n °20 - 1	P20 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5903 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 2)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises en fibrociment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n °21 - 1	P21	Fibrociment gris avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5903 n °22 - 1	P22 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002ER68 5903 n °22 - 1	P22 Phase 2	Colle polymère blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68 5903 n °23 - 1	P23 Phase 1	Revêtement souple orange	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### R+1 - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68 5903 n°23 - 1	P23 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5903 n°24 - 1	P24	Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bains)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Blanc	002ER68 5903 n°24 - 1	P24	Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER685903 n°1 - 1	P1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER685903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

**RDC - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER68 5903 n°2 - 1	P2	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002ER68 5903 n°3 - 1	P3	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002ER68 5903 n°4 - 1	P4	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

**RDC - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S14 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Rouge	002ER68 5903 n°4 - 1	P4	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P5	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER68 5903 n°5 - 1	P5	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S17 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Noire	002ER68 5903 n°5 - 1	P5	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5903 n°6 - 1	P6	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 5 (WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S18 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Gris	002ER68 5903 n°6 - 1	P6	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Vert	002ER68 5903 n°7 - 1	P7	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Vert	002ER68 5903 n°7 - 1	P7	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Vert	002ER68 5903 n°7 - 1	P7	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse



Amiante

**RDC - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER685903 n°8 - 1	P8	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S21 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Noire	002ER685903 n°8 - 1	P8	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S22 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Noire	002ER685903 n°8 - 1	P8	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685903 n°9 - 1	P9	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S23 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Gris	002ER685903 n°9 - 1	P9	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S24 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Gris	002ER685903 n°9 - 1	P9	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S25 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Gris	002ER685903 n°9 - 1	P9	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER685903 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5903 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle polymère blanche + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5903 n°11 - 1	P11 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002ER68 5903 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle polymère blanche + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER685903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER685903 n°12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Autre local privatif)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER68 5903 n °12 - 1	P12	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Autre local privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

### RDC - logement 53

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

**RDC - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 7 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER68 5903 n °13 - 1	P13	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n °14 - 1	P14	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Façades	Murs	Enduit ciment	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER68 5903 n °14 - 1	P14	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse


**RDC - logement 53**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Parking couvert privatif)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n °15 - 1	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER68 5903 n °16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER68 5903 n °16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER68 5903 n °16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER68 5903 n °16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Parking couvert privatif)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70 - S71 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER68 5903 n °16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
<b>R+1 - logement 53</b>							
P19	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré	Vol 13 (Autre local privatif) - Vol 10 (Autre local privatif)	13,91 m		4,24 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
<b>RDC - logement 53</b>							
P4	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable	Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC) - Vol 10 (Autre local privatif) - Vol 13 (Autre local privatif)	31,03 m		14,2 m²	
P5	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC)	17,14 m		9,93 m²	
P6	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (WC)	17,44 m		10,23 m²	
P7	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif)	42,95 m		35,7 m²	
P8	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable	Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif)	43,03 m		35,81 m²	
P9	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 3 (Autre local privatif) - Vol 4 (Dégagement)	48,15 m		37,36 m²	





## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC - logement 53	RDC - logement 53 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - logement 53	RDC - logement 53 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - logement 53	RDC - logement 53 - MPCA Revêtement de sol
	R+1 - logement 53	R+1 - logement 53 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 - logement 53	R+1 - logement 53 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 - logement 53	R+1 - logement 53 - MPCA Revêtement de sol

RDC - LOGEMENT 53 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685903

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

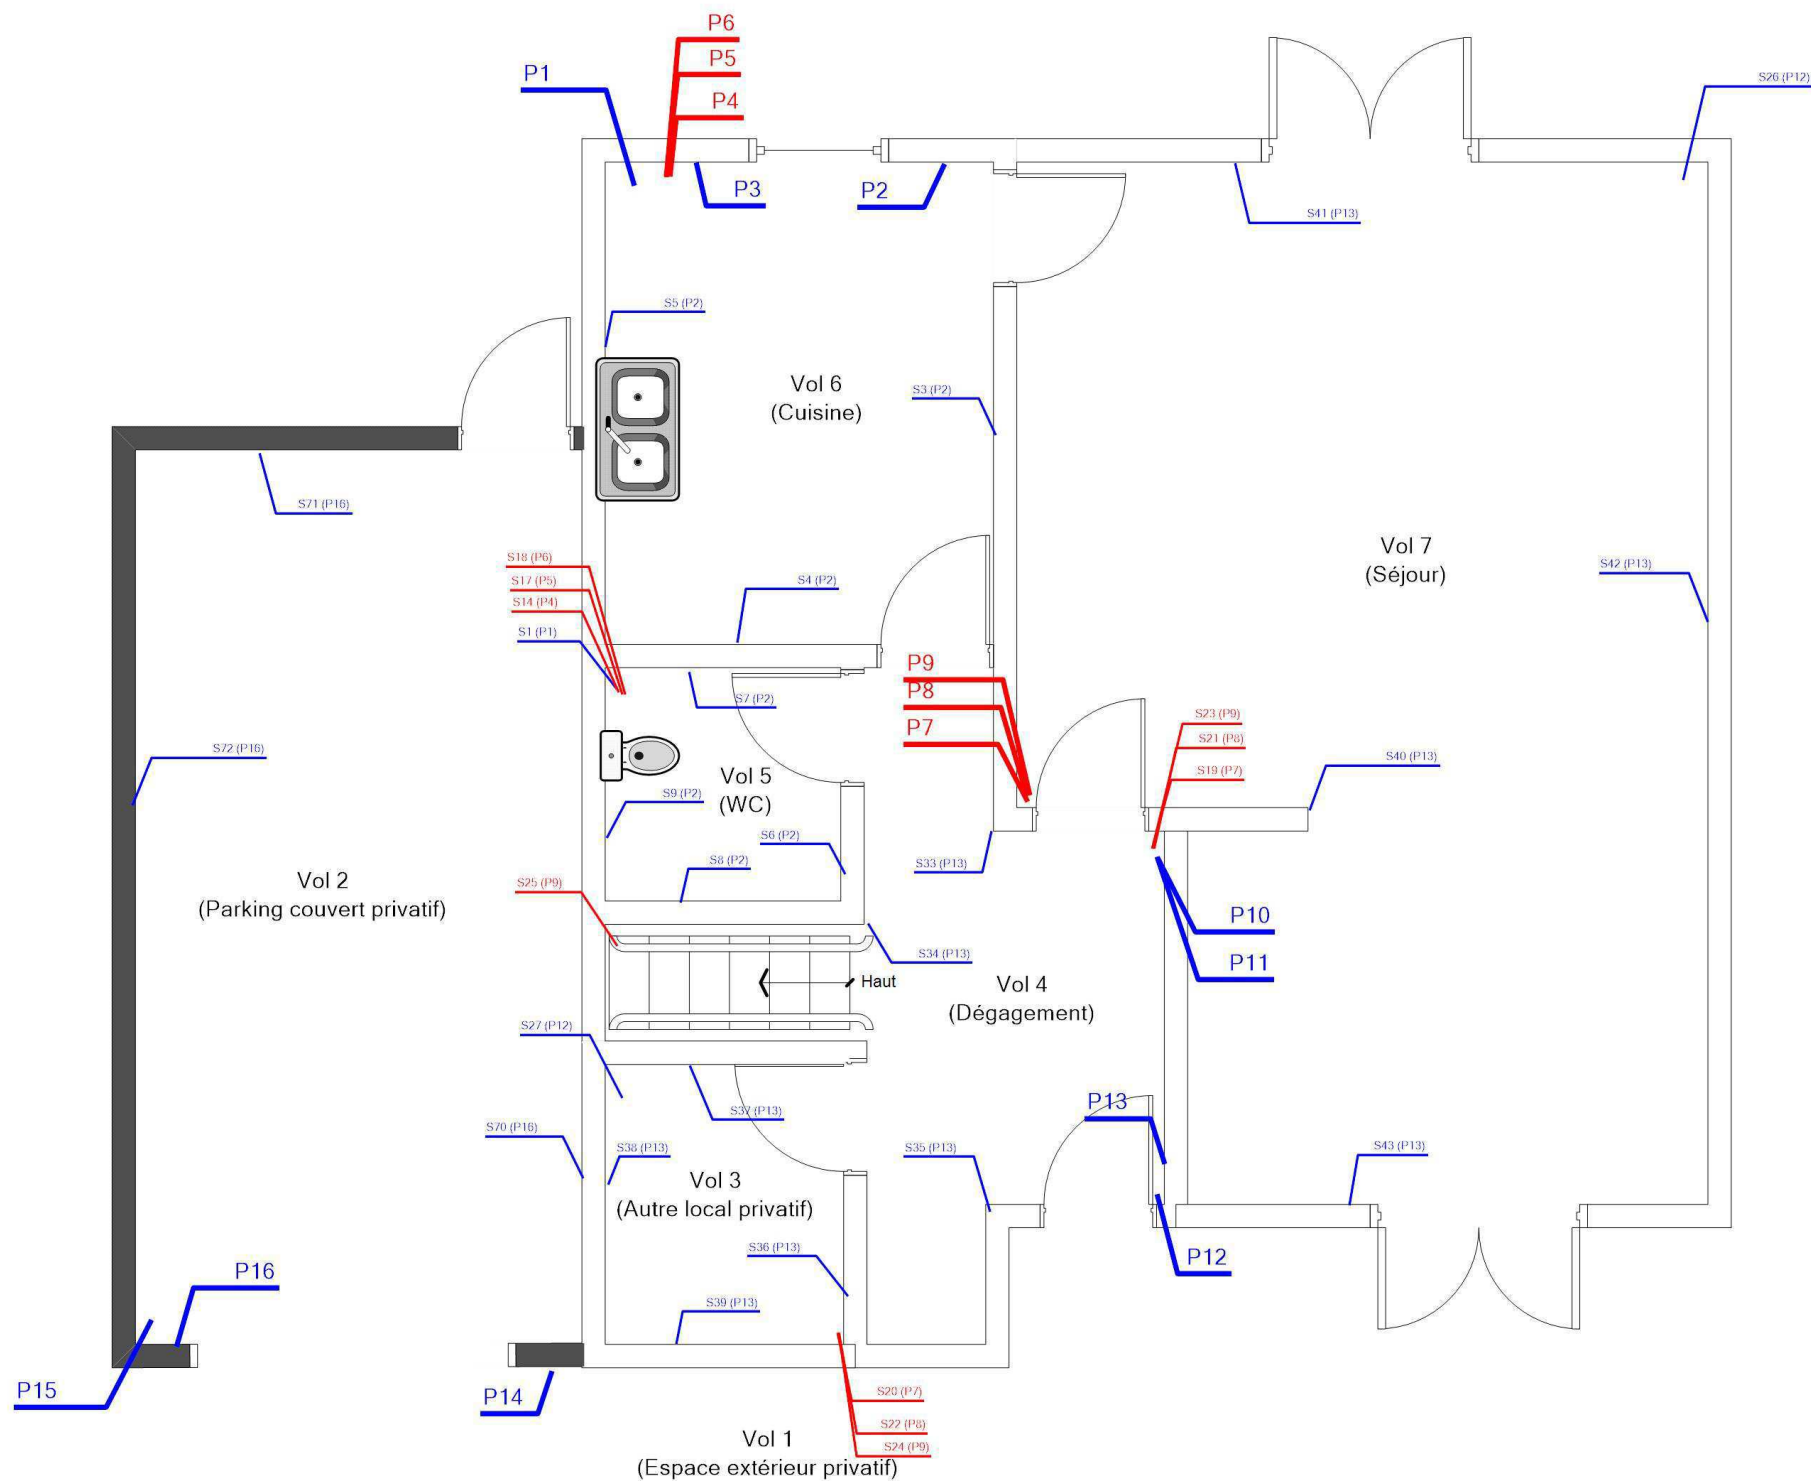



Légende



P5 : Colle bitumeuse



P4 : Dalles plastiques



P7 : Dalles plastiques




P6 : Ragréage










P8 : Colle bitumeuse

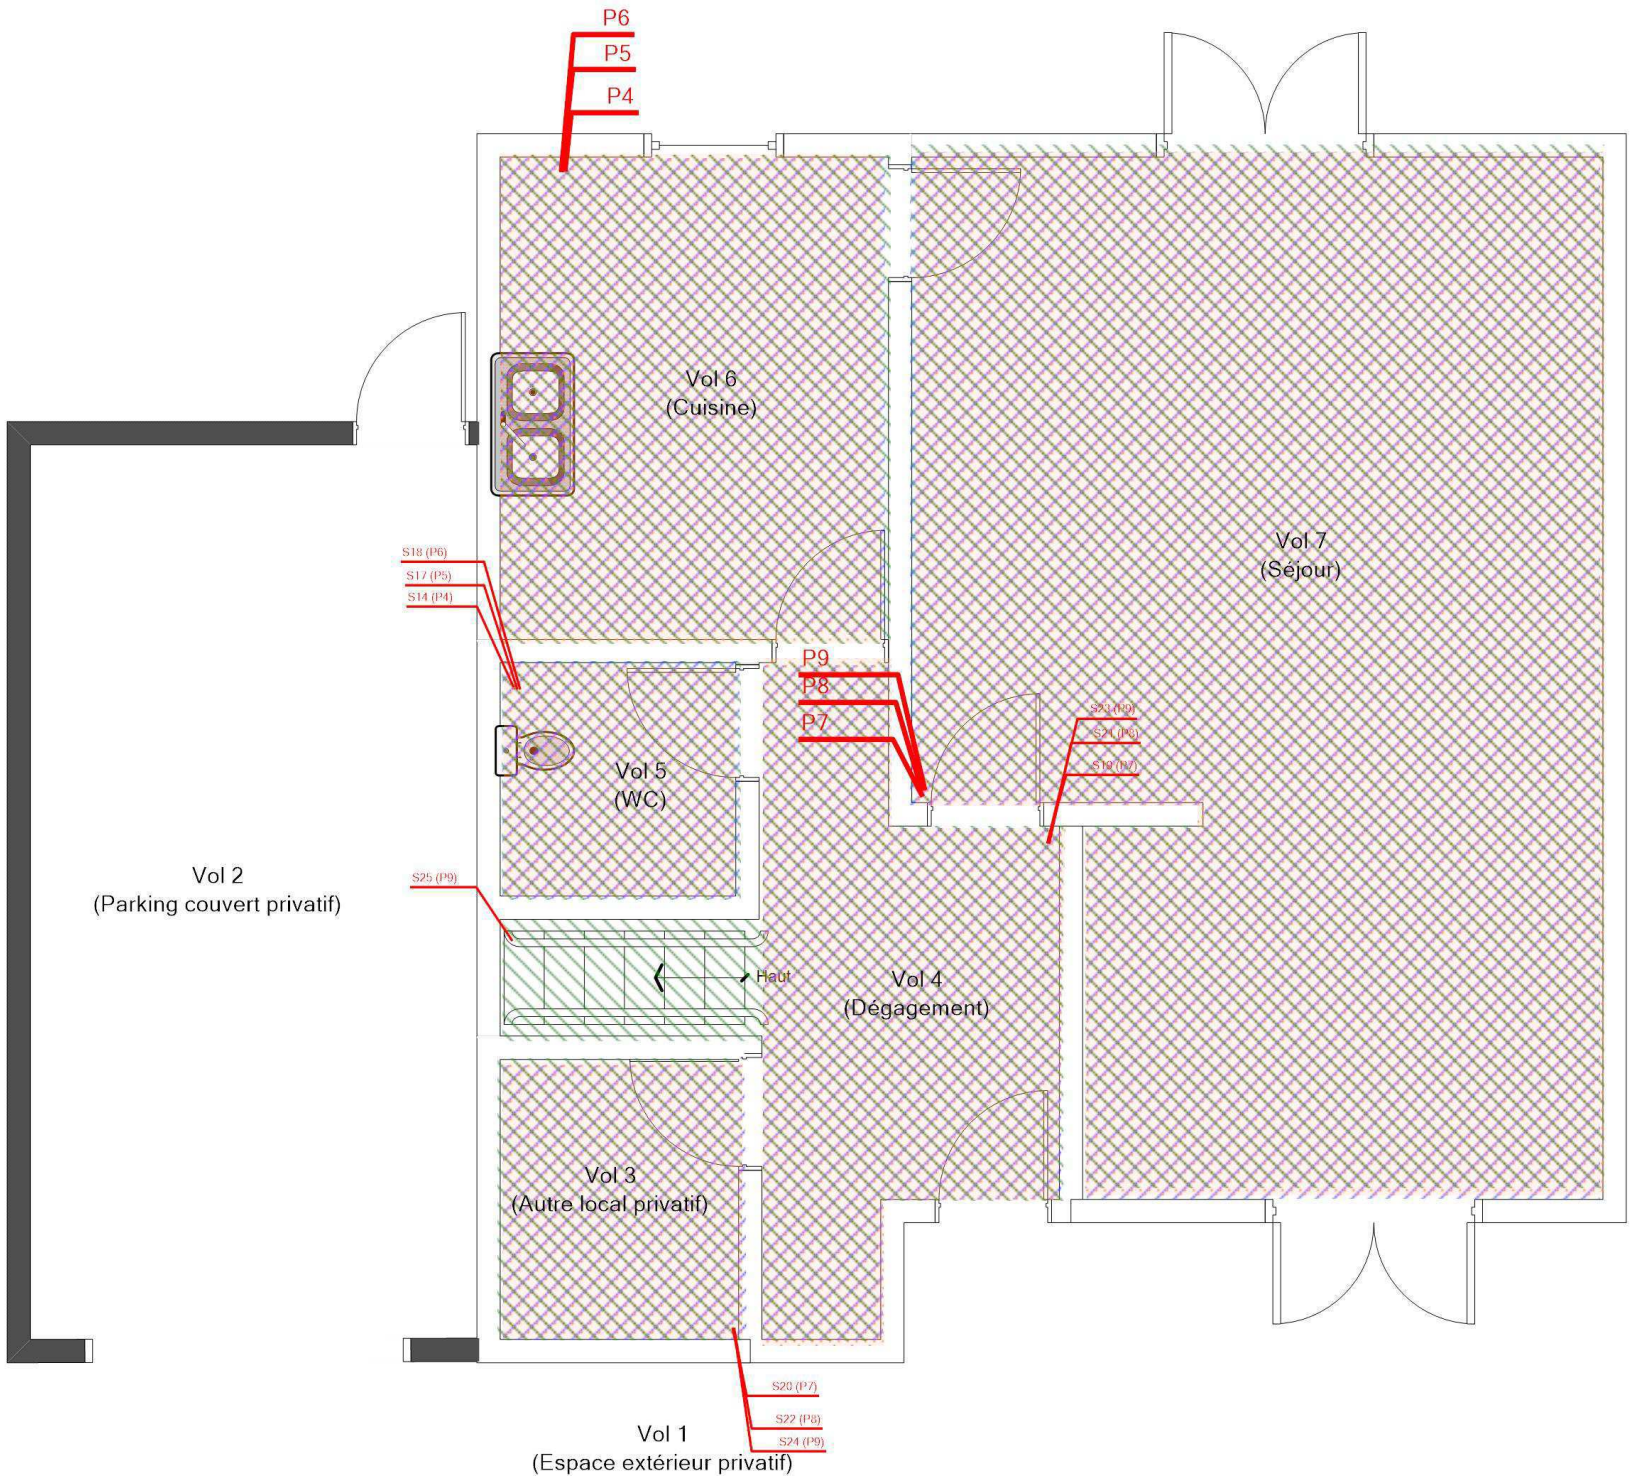

P9 : Ragréage

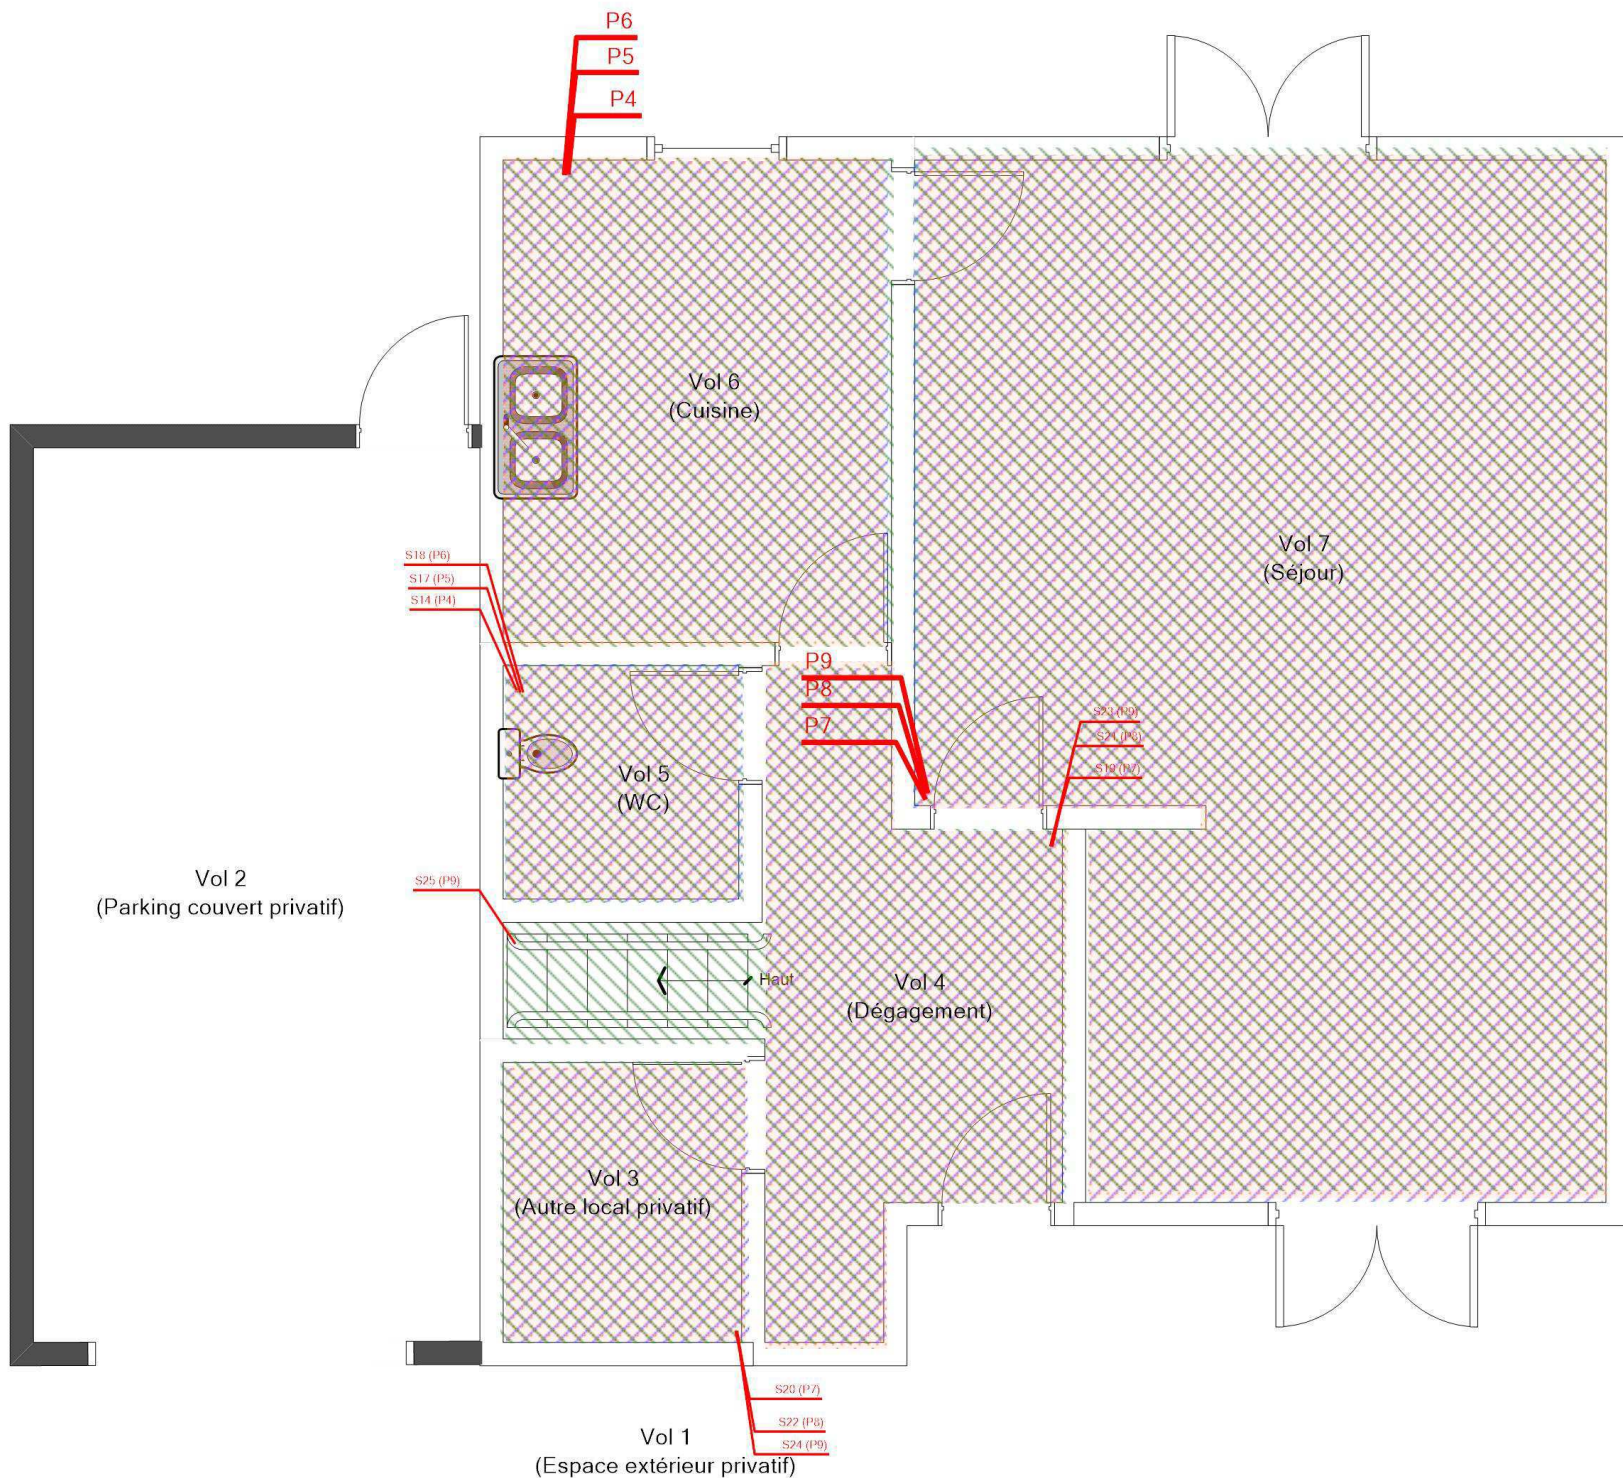





RDC - LOGEMENT 53 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685903
	Légende			
		P5 : Colle bitumeuse		
		P4 : Dalles plastiques		
		P7 : Dalles plastiques		
		P6 : Ragréage		
		P8 : Colle bitumeuse		
		P9 : Ragréage		
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
N°53 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		Autres Privatif	07/12/2023	AUPETIT MATHIS

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

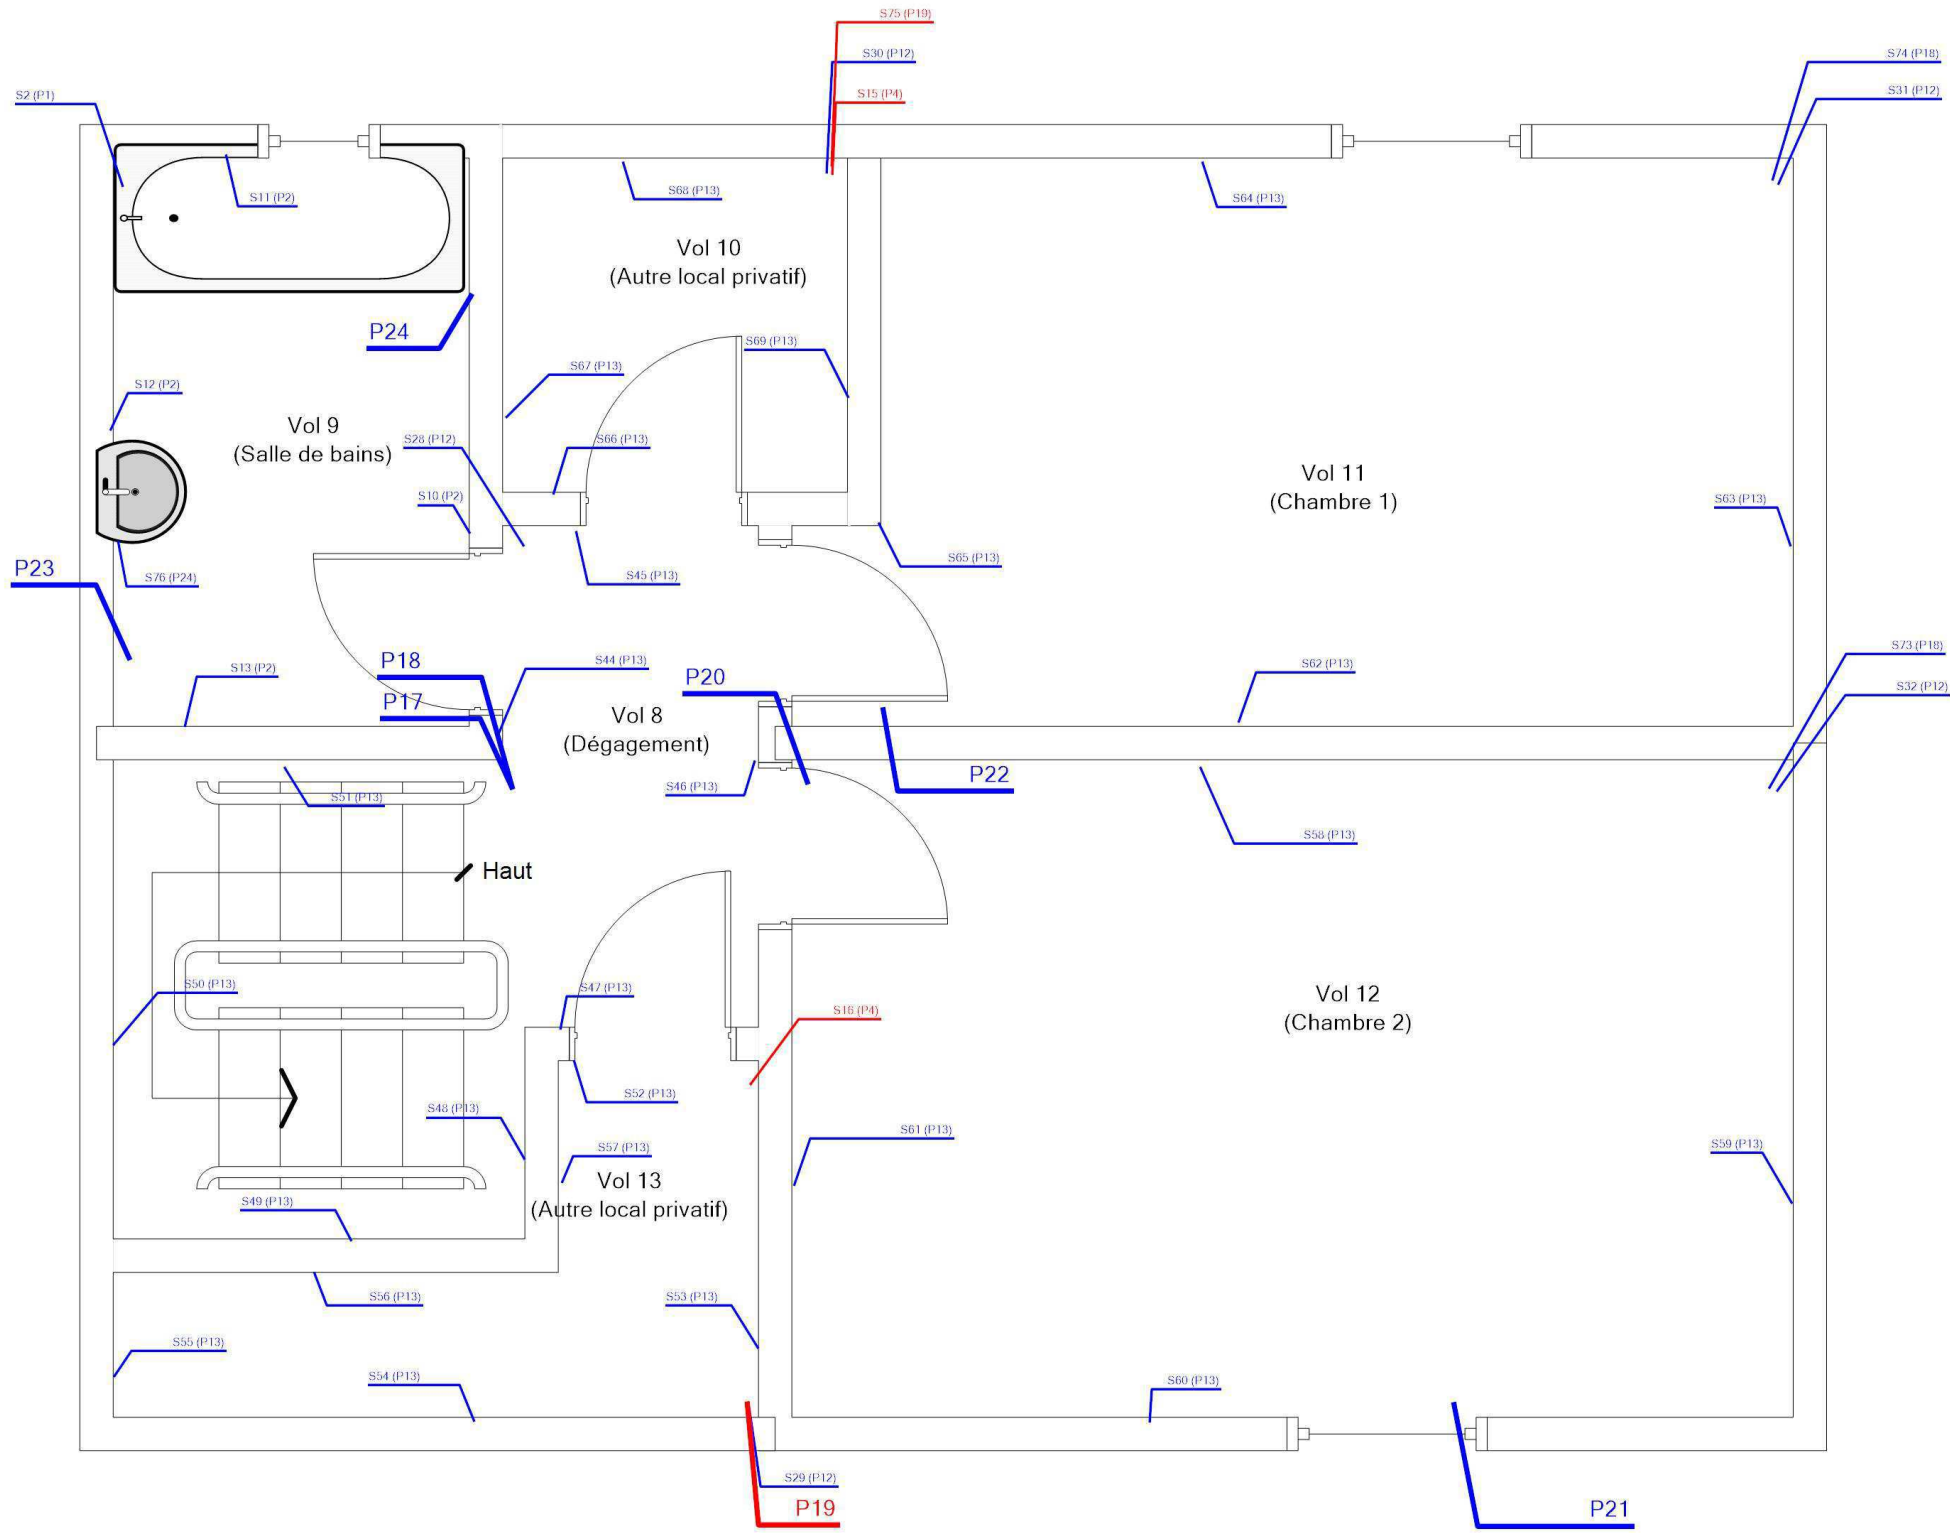



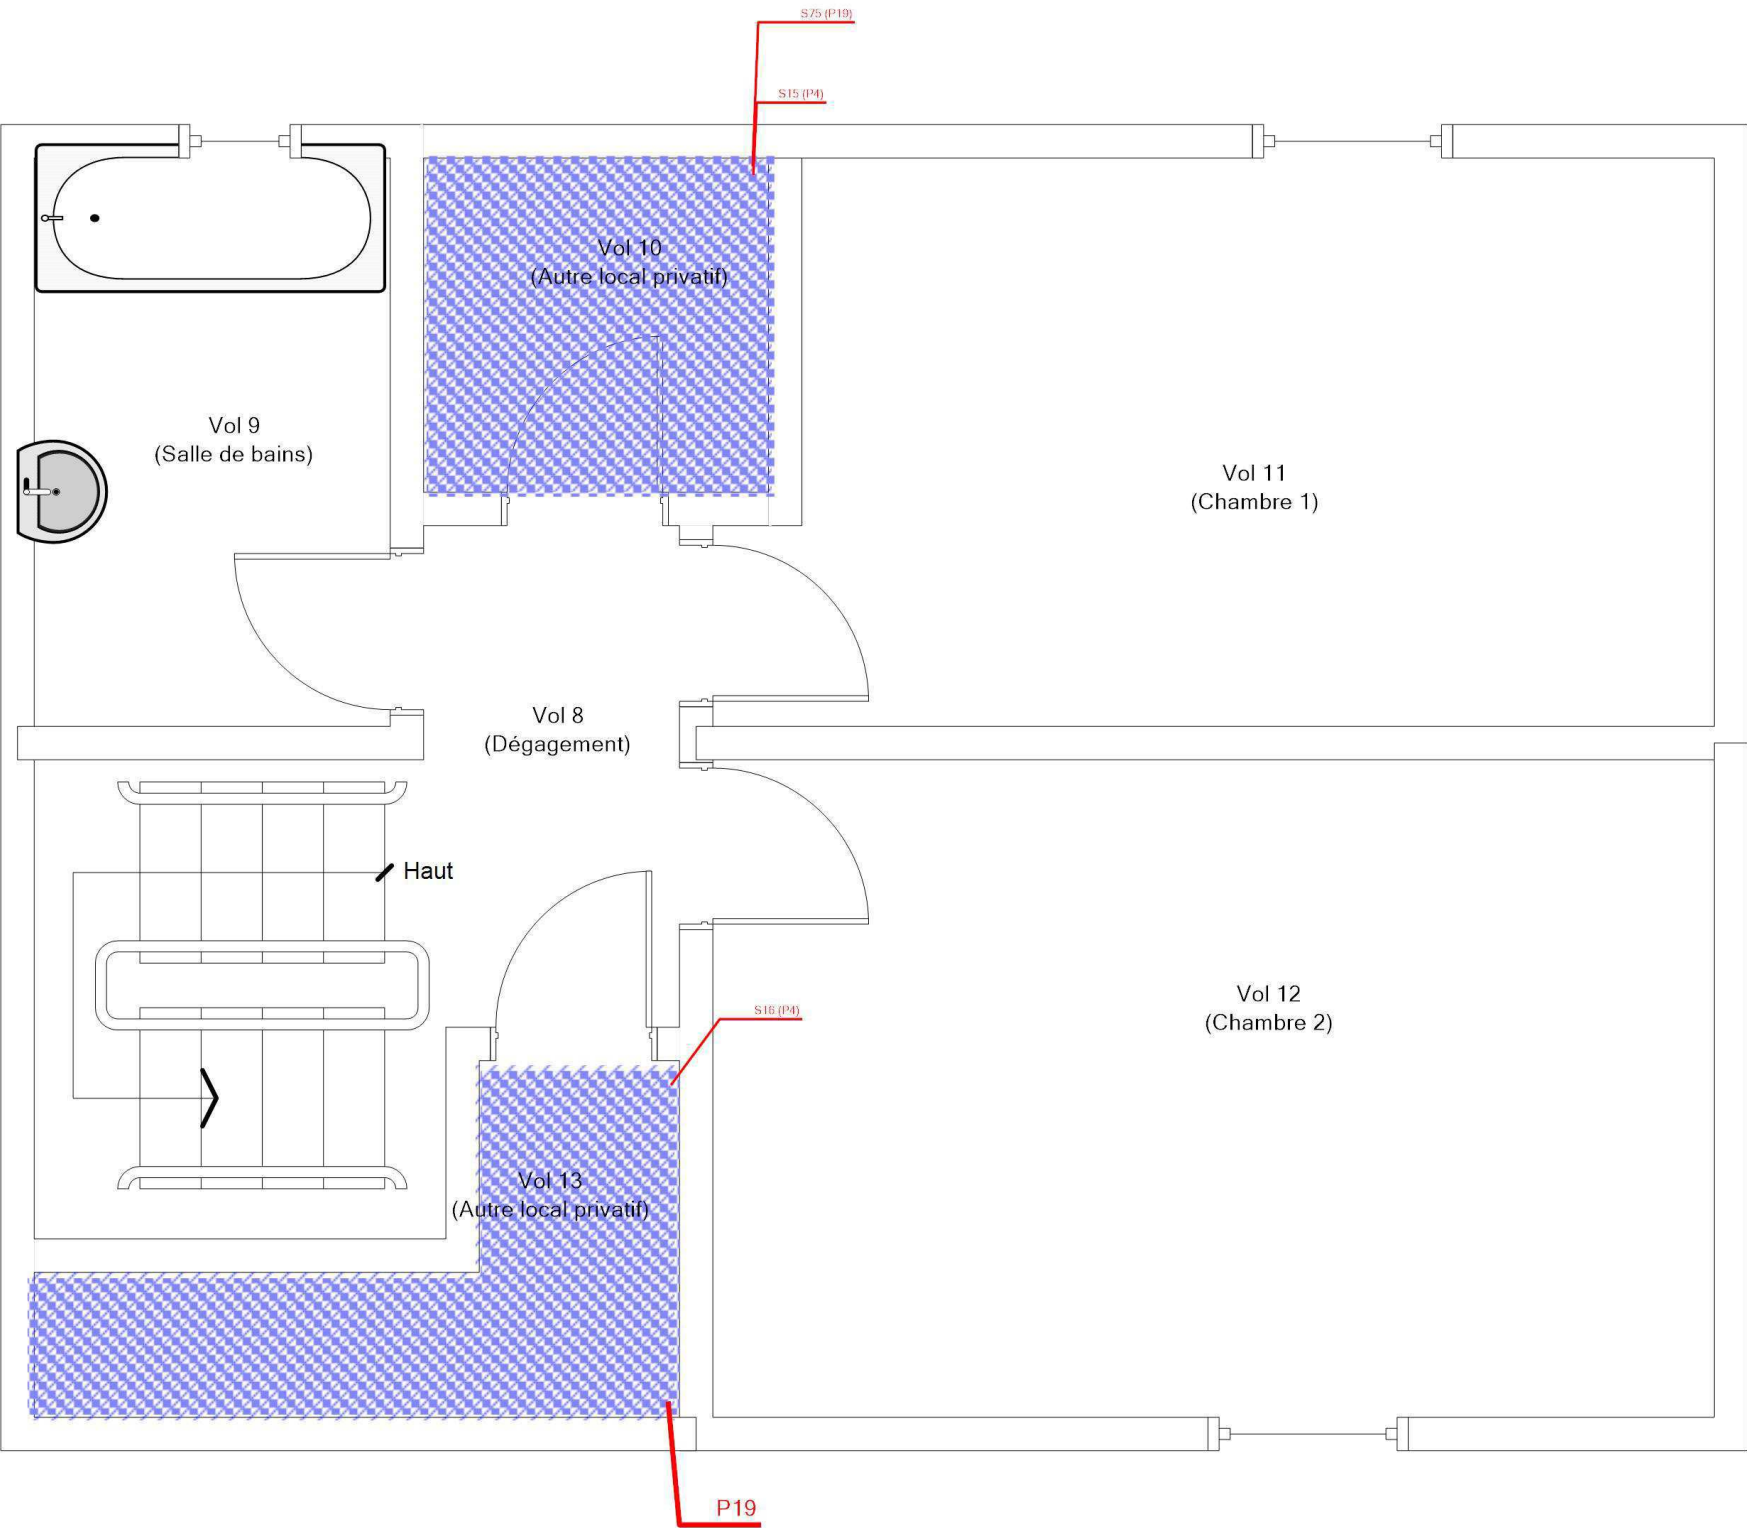


Légende	
	P19 : Colles de revêtement de sol
	P4 : Dalles plastiques

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°53 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Autres Privatif	07/12/2023	AUPETIT MATHIS


Légende



P19 : Colles de revêtement de sol



P4 : Dalles plastiques

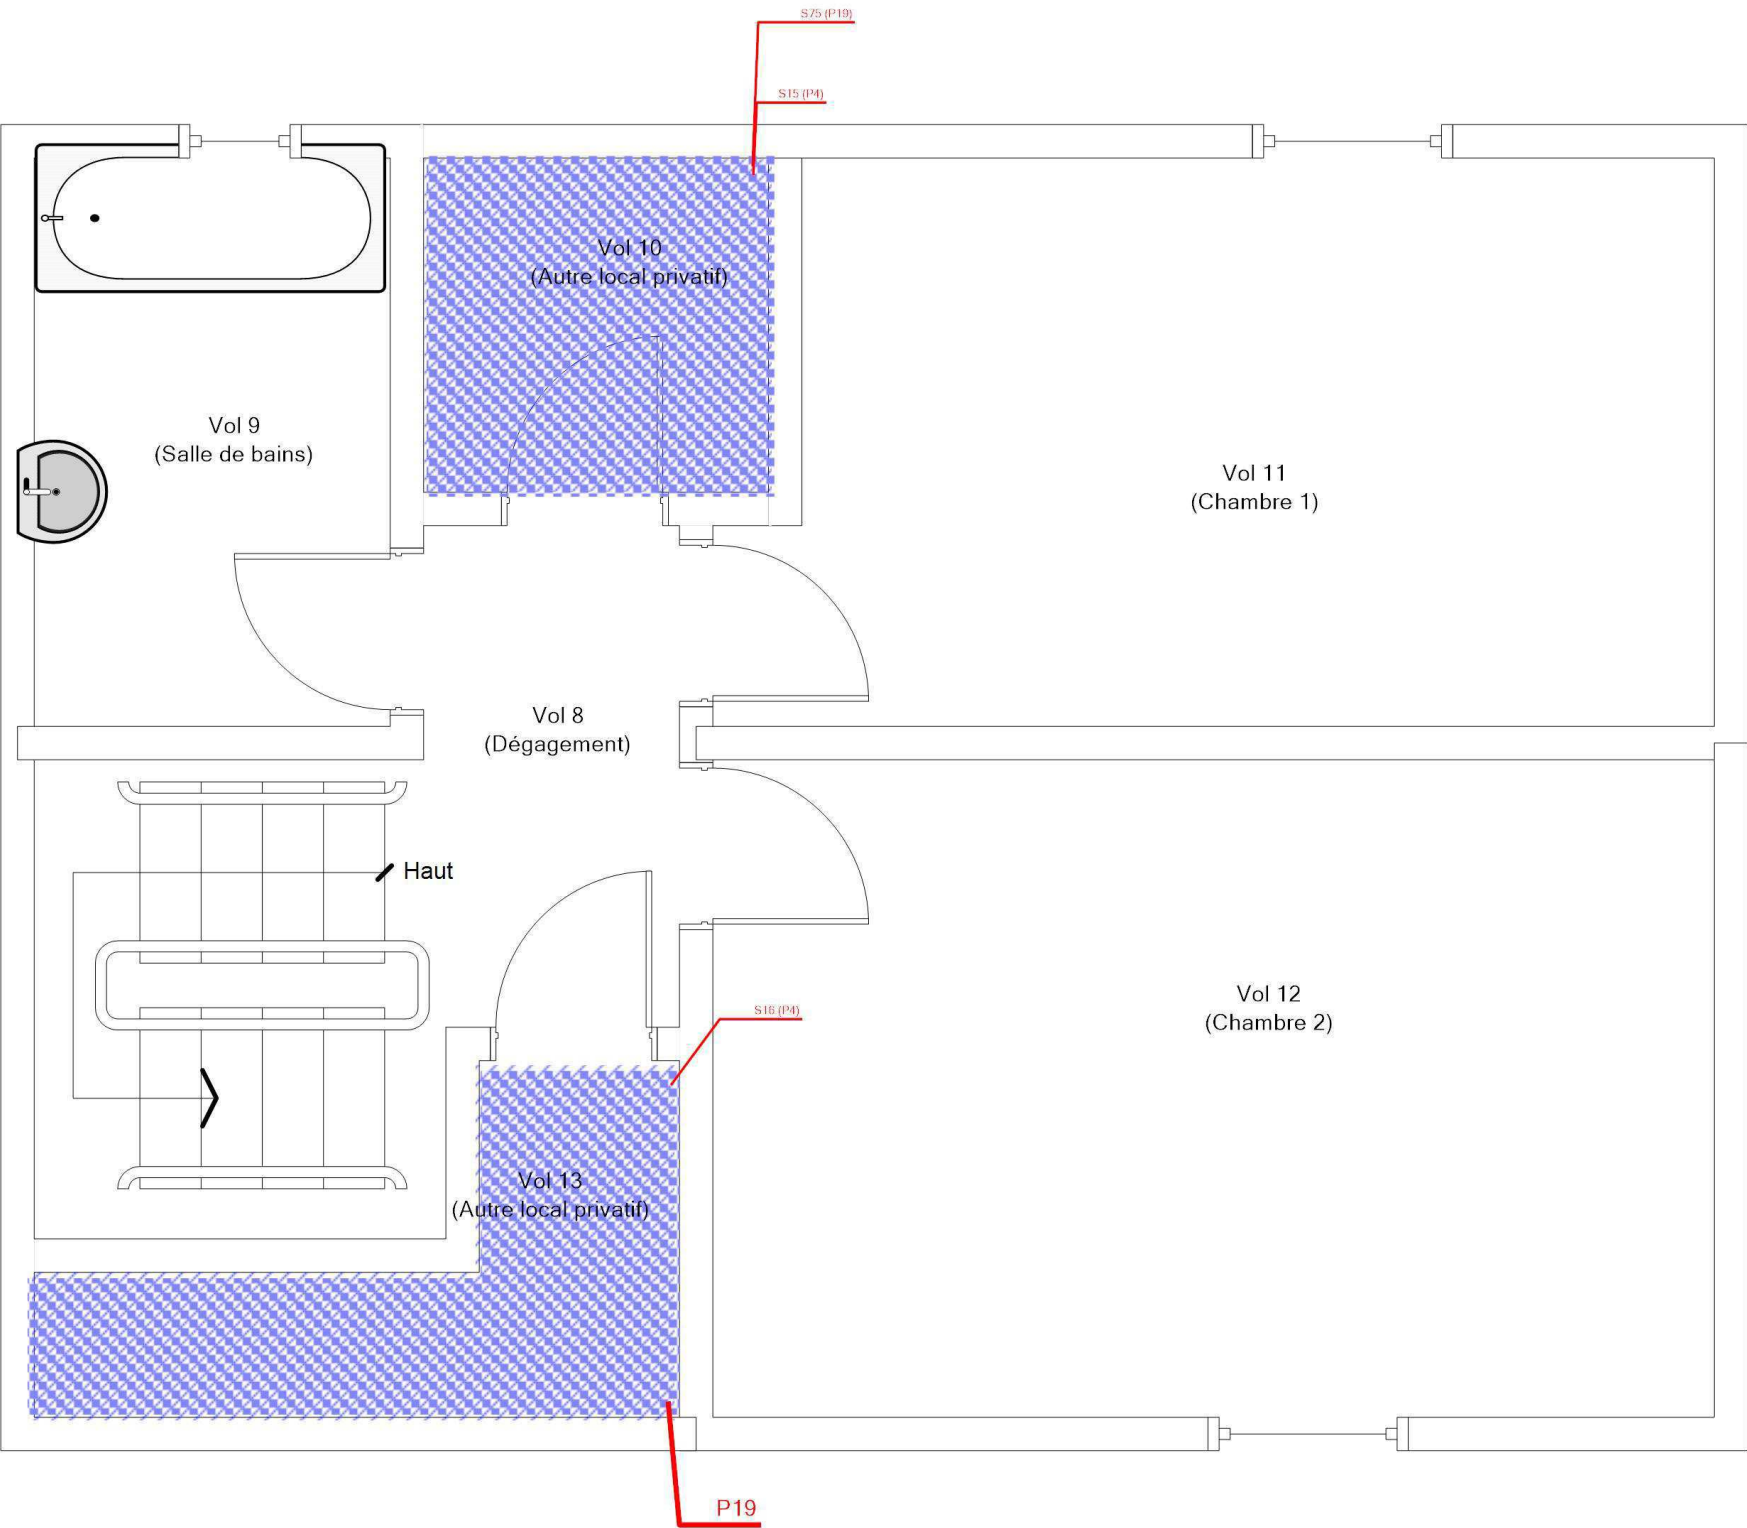



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER685903 n°17 - 1 (P17)	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685903 n°18 - 1 (P18)	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685903 n°19 - 1 (P19)	R+1 - logement 53 - Vol 13 (Autre local privatif)	Prélevement positif
002ER685903 n°20 - 1 (P20)	R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002ER685903 n°21 - 1 (P21)	R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002ER685903 n°22 - 1 (P22)	R+1 - logement 53 - Vol 11 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER685903 n°23 - 1 (P23)	R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685903 n°24 - 1 (P24)	R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)	Prélevement négatif
002ER685903 n°1 - 1 (P1)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685903 n°2 - 1 (P2)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685903 n°3 - 1 (P3)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002ER685903 n°4 - 1 (P4)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002ER685903 n°5 - 1 (P5)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002ER685903 n°6 - 1 (P6)	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement positif
002ER685903 n°7 - 1 (P7)	RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement positif
002ER685903 n°8 - 1 (P8)	RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement positif
002ER685903 n°9 - 1 (P9)	RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement positif
002ER685903 n°10 - 1 (P10)	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685903 n°11 - 1 (P11)	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685903 n°12 - 1 (P12)	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685903 n°13 - 1 (P13)	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER685903 n°14 - 1 (P14)	RDC - logement 53 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)	Prélevement négatif
002ER685903 n°15 - 1 (P15)	RDC - logement 53 - Vol 2 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif
002ER685903 n°16 - 1 (P16)	RDC - logement 53 - Vol 2 (Parking couvert privatif)	Prélevement négatif



002ER685903 n°1 - 1 (P1) - RDC - logement 53 - Vol 6  
(Cuisine)




002ER685903 n°2 - 1 (P2) - RDC - logement 53 - Vol 6  
(Cuisine)



002ER685903 n°3 - 1 (P3) - RDC - logement 53 - Vol 6  
(Cuisine)



002ER685903 n°4 - 1 (P4) - RDC - logement 53 - Vol 6  
(Cuisine)



002ER685903 n°5 - 1 (P5) - RDC - logement 53 - Vol 6  
(Cuisine)



002ER685903 n°6 - 1 (P6) - RDC - logement 53 - Vol 6  
(Cuisine)



002ER685903 n°7 - 1 (P7) - RDC - logement 53 - Vol 7  
(Séjour)



002ER685903 n°8 - 1 (P8) - RDC - logement 53 - Vol 7  
(Séjour)



002ER685903 n°9 - 1 (P9) - RDC - logement 53 - Vol 7  
(Séjour)



002ER685903 n°10 - 1 (P10) - RDC - logement 53 - Vol  
4 (Dégagement)



002ER685903 n°11 - 1 (P11) - RDC - logement 53 - Vol 4  
(Dégagement)



002ER685903 n°12 - 1 (P12) - RDC - logement 53 - Vol  
4 (Dégagement)





002ER685903 n°13 - 1 (P13) - RDC - logement 53 - Vol 4  
(Dégagement)



002ER685903 n°14 - 1 (P14) - RDC - logement 53 - Vol  
1 (Espace extérieur privatif)



002ER685903 n°15 - 1 (P15) - RDC - logement 53 - Vol 2  
(Parking couvert privatif)



002ER685903 n°16 - 1 (P16) - RDC - logement 53 - Vol  
2 (Parking couvert privatif)



002ER685903 n°17 - 1 (P17) - R+1 - logement 53 - Vol 8  
(Dégagement)



002ER685903 n°18 - 1 (P18) - R+1 - logement 53 - Vol  
8 (Dégagement)



002ER685903 n°19 - 1 (P19) - R+1 - logement 53 - Vol 13 (Autre local privatif)



002ER685903 n°20 - 1 (P20) - R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)




002ER685903 n°21 - 1 (P21) - R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)



002ER685903 n°22 - 1 (P22) - R+1 - logement 53 - Vol 11 (Chambre 1)



002ER685903 n°23 - 1 (P23) - R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)

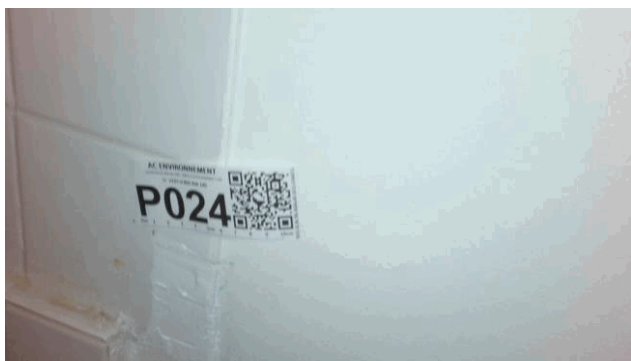

002ER685903 n°24 - 1 (P24) - R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - Blanc -	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire non séparable - Rouge -	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Noire -	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Gris -	RDC - logement 53 - Vol 6 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable - Vert -	RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte + colle bitumineuse noire non séparable - Noire -	RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris - Gris -	RDC - logement 53 - Vol 7 (Séjour)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Gris -	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)	

P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère blanche + peintures multiples non séparable - Gris -	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Gris -	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère blanche + peintures multiples non séparable - Gris -	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - -	RDC - logement 53 - Vol 4 (Dégagement)
P14	Façades	Murs	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris - -	RDC - logement 53 - Vol 1 (Espace extérieur privatif)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	RDC - logement 53 - Vol 2 (Parking couvert privatif)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - -	RDC - logement 53 - Vol 2 (Parking couvert privatif)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Beige -	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Beige -	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)
P18 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Blanc -	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)
P18 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir - Blanc -	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)
P18 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable - Blanc -	R+1 - logement 53 - Vol 8 (Dégagement)



P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré - Jaune -	R+1 - logement 53 - Vol 13 (Autre local privatif)
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - Marron -	R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)
P20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Marron -	R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)
P21	Toiture et étanchéité	Ardoises	Fibrociment gris avec fibres - -	R+1 - logement 53 - Vol 12 (Chambre 2)
P22 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - Marron -	R+1 - logement 53 - Vol 11 (Chambre 1)
P22 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère blanche - Marron -	R+1 - logement 53 - Vol 11 (Chambre 1)
P23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange - Rouge -	R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)
P23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Rouge -	R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable - Blanc -	R+1 - logement 53 - Vol 9 (Salle de bains)





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av  
de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D' ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
www.itga.fr



**afel**  
Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

<b>Client :</b> AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	<b>Réf. Commande ITGA :</b> IT1123-24452  <b>Réf. Commande Client :</b> 002ER685903
--	---

**Prélèvement(s) :** Reçu au laboratoire le : 12/12/2023

**Préparation(s) :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
**ou** - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

**Technique(s)** - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

**Analytique(s) :** La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**ou** - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat(s) :**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7835	
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Cuisine)		<b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Cuisine)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7836  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée		
<b>Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7837  <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture / Carrelage / Colle beige /</b> <b>Couche plâtrée blanche</b>		
<b>Peinture non séparable + Carrelage</b>	---	Non analysé	
<b>Colle beige + Couche plâtrée blanche non séparable</b>	<b>META (A) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 6 (Cuisine)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7838  <b>Description ITGA :</b> Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire		
<b>Dalle dure cassante rouge + Colle bitumineuse noire non séparable</b>	<b>META (B) le 15/12/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Présence de fibres d'amiante / Chrysotile</b>	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 6 (Cuisine)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7839  <b>Description ITGA :</b> Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
<b>Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris</b>	<b>META (B) le 18/12/2023</b> Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	<b>Présence de fibres d'amiante / Chrysotile</b>	Analyste : YYC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-7840	
Réf échantillon client : 002ER685903006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 6 (Cuisine)		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréege gris	
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréege gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-7841	
Réf échantillon client : 002ER685903007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 7 (Séjour)		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire	
▶ Dalle dure cassante verte + Colle bitumineuse noire non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-7842	
Réf échantillon client : 002ER685903008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 7 (Séjour)		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire	
▶ Dalle dure cassante verte + Colle bitumineuse noire non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (3)
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif		Réf échantillon ITGA : IT112312-7843	
Réf échantillon client : 002ER685903009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 7 (Séjour)		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréege gris	
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréege gris	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LHB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7844  <b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple gris / Colle polymère blanche / <b>Peintures multiples</b>	
<b>▶ Revêtement souple gris</b>	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
<b>▶ Colle polymère blanche + Peintures multiples non séparable</b>	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (3)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7845  <b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple gris / Colle polymère blanche / <b>Peintures multiples</b>	
<b>▶ Revêtement souple gris</b>	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
<b>▶ Colle polymère blanche + Peintures multiples non séparable</b>	META (B) le 18/12/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Dégagement)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7846  <b>Description ITGA :</b>	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
<b>▶ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</b>	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Dégagement)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7847	
		<b>Description ITGA :</b>	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903014 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Façade)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7848	
		<b>Description ITGA :</b>	Peintures multiples / Enduit compact gris
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 2 (Garage)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7849	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau compact gris hétérogène
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Garage)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7850	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau compact gris hétérogène
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div>Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif</div> <div>Réf échantillon client : 002ER685903017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT112312-7851</div> <div>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune</div> </div>			
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
<div> <div>Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif</div> <div>Réf échantillon client : 002ER685903018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Dégagement)</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT112312-7852</div> <div>Description ITGA : Colle polymère jaune / Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / <b>Bois sous forme de fibres en faible quantité</b></div> </div>			
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▶ Colle polymère jaune + Bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (3)
<div> <div>Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif</div> <div>Réf échantillon client : 002ER685903019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 13 (Autre local privatif)</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT112312-7853</div> <div>Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois aggloméré</div> </div>			
▶ Colle polymère jaune non séparable + (Bois aggloméré)	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXP (3)

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Chambre 2)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7854	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903021 / Toiture et étanchéité / Ardoises / Ardoises en fibro ciment / Vol 12 (Chambre 2)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7855	
		<b>Description ITGA :</b>	Fibrociment gris avec fibres
▸ Fibrociment gris avec fibres	MOLP + META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 11 (Chambre 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7856	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple marron / Colle polymère blanche
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
▸ Colle polymère blanche	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
<b>Réf dossier client :</b> BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif <b>Réf échantillon client :</b> 002ER685903023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Salle de bains)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112312-7857	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple orange / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple orange	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-24452 EN DATE DU 18/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : BVIL-MI_BVIL-MI-53V_007587 N°53 RUE VERLAINE - 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE Autres Privatif Réf échantillon client : 002ER685903024 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Salle de bains)			
		Réf échantillon ITGA : IT112312-7858	
		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée	
Peintures multiples non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 15/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
