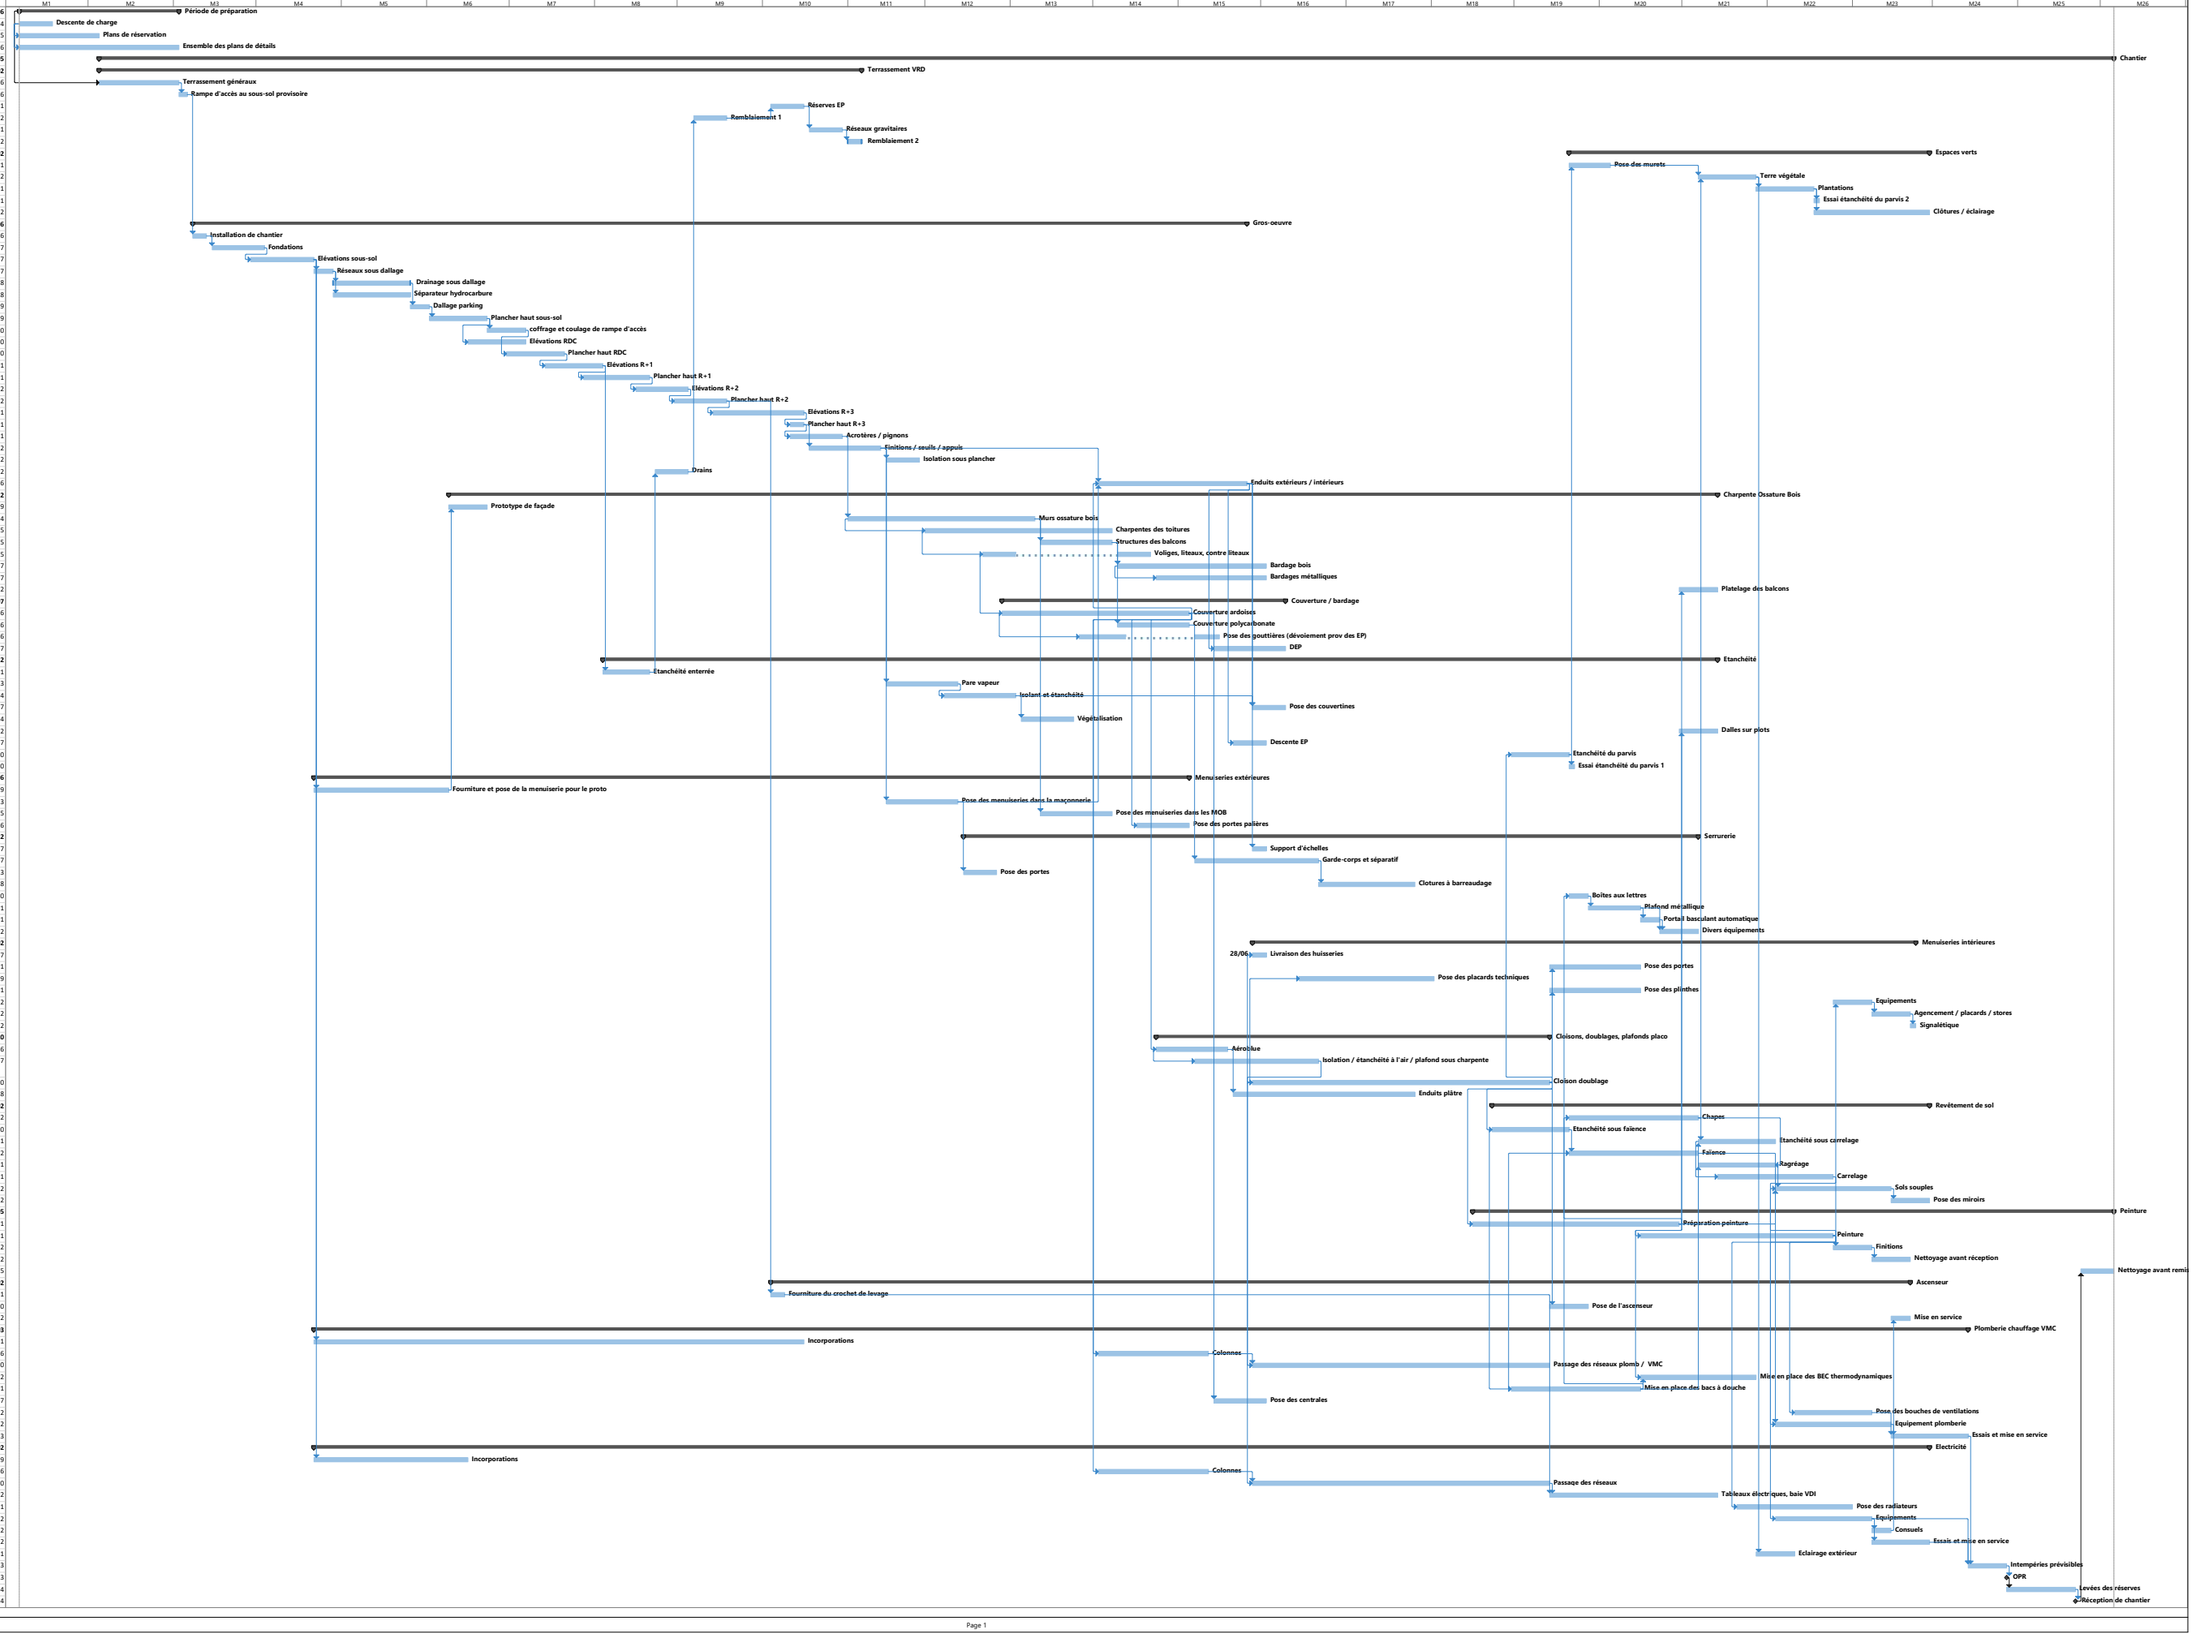N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Période de préparation**	**40 j**	**06/04**	**02/06**
2	Descente de charge	2 sm	06/04	17/04
3	Plans de réservation	4 sm	06/04	04/05
4	Ensemble des plans de détails	8 sm	06/04	02/06
5	**Chantier**	**472 j**	**05/05**	**05/05**
6	**Terrassement VRD**	**168 j**	**05/05**	**05/02**
7	Terrassement généraux	4 sm	05/05	02/06
8	Rampe d'accès au sous-sol provisoire	3 j	03/06	05/06
9	Réserves EP	2 sm	04/01	15/01
10	Remblaiement 1	2 sm	07/12	18/12
11	Réseaux gravitaires	2 sm	18/01	29/01
12	Remblaiement 2	1 sm	01/02	05/02
13	**Espaces verts**	**90 j**	**21/10**	**28/02**
14	Pose des murets	2 sm	21/10	04/11
15	Terre végétale	3 sm	07/12	27/12
16	Plantations	3 sm	28/12	17/01
17	Essai étanchéité du parvis 2	2 j	18/01	19/01
18	Clôtures / éclairage	6 sm	18/01	28/02
19	**Gros-oeuvre**	**245 j**	**08/06**	**25/06**
20	Installation de chantier	1 sm	08/06	12/06
21	Fondations	3 sm	15/06	03/07
22	Elévations sous-sol	3 sm	29/06	21/07
23	Réseaux sous dallage	1 sm	22/07	28/07
24	Drainage sous dallage	1 sm	29/07	25/08
25	Séparateur hydrocarbure	1 sm	29/07	25/08
26	Dallage parking	1 sm	26/08	01/09
27	Plancher haut sous-sol	3 sm	02/09	22/09
28	coffrage et coulage de rampe d'accès	2 sm	23/09	06/10
29	Elévations RDC	3 sm	16/09	06/10
30	Plancher haut RDC	3 sm	30/09	20/10
31	Elévations R+1	3 sm	14/10	03/11
32	Plancher haut R+1	3 sm	28/10	20/11
33	Elévations R+2	3 sm	16/11	04/12
34	Plancher haut R+2	3 sm	30/11	18/12
35	Elévations R+3	3 sm	14/12	15/01
36	Plancher haut R+3	1 sm	11/01	15/01
37	Acrotères / pignons	3 sm	11/01	29/01
38	Finitions / seuils / appuis	4 sm	18/01	12/02
39	Isolation sous plancher	2 sm	15/02	26/02
40	Drains	2 sm	23/11	04/12
41	Enduits extérieurs / intérieurs	8 sm	03/05	25/06
42	**Charpente Ossature Bois**	**295 j**	**09/09**	**13/12**
43	Prototype de façade	2 sm	09/09	22/09
44	Murs ossature bois	10 sm	01/02	09/04
45	Charpentes des toitures	10 sm	01/03	07/05
46	Structures des balcons	4 sm	12/04	07/05
47	Voliges, liteaux, contre liteaux	4 sm	22/03	21/05
48	Bardage bois	8 sm	10/05	02/07
49	Bardages métalliques	6 sm	24/05	02/07
50	Platelage des balcons	2 sm	30/11	13/12
51	**Couverture / bardage**	**75 j**	**29/03**	**09/07**
52	Couverture ardoises	10 sm	29/03	04/06
53	Couverture polycarbonate	4 sm	10/05	04/06
54	Pose des gouttières (dévoiement prov des EP)	4 sm	26/04	15/06
55	DEP	4 sm	14/06	09/07
56	**Etanchéité**	**255 j**	**04/11**	**13/12**
57	Etanchéité enterrée	2 sm	04/11	20/11
58	Pare vapeur	4 sm	15/02	12/03
59	Isolant et étanchéité	4 sm	08/03	02/04
60	Pose des couvertines	2 sm	28/06	09/07
61	Végétalisation	3 sm	05/04	23/04
62	Dalles sur plots	2 sm	30/11	13/12
63	Descente EP	2 sm	21/06	02/07
64	Etanchéité du parvis	3 sm	30/09	20/10
65	Essai étanchéité du parvis 1	2 j	21/10	22/10
66	**Menuiseries extérieures**	**200 j**	**22/07**	**04/06**
67	Fourniture et pose de la menuiserie pour le pr	4 sm	22/07	08/09
68	Pose des menuiseries dans la maçonnerie	4 sm	15/02	12/03
69	Pose des menuiseries dans les MOB	4 sm	12/04	07/05
70	Pose des portes palières	3 sm	17/05	04/06
71	**Serrurerie**	**170 j**	**15/03**	**06/12**
72	Support d'échelles	1 sm	28/06	02/07
73	Garde-corps et séparatif	6 sm	07/06	21/07
74	Pose des portes	2 sm	15/03	26/03
75	Clotures à barreaudage	2 sm	22/07	25/08
76	Boîtes aux lettres	1 sm	21/10	27/10
77	Plafond métallique	2 sm	28/10	15/11
78	Portail basculant automatique	1 sm	16/11	22/11
79	Divers équipements	2 sm	23/11	06/12
80	**Menuiseries intérieures**	**152 j**	**28/06**	**23/02**
81	Livraison des huisseries	1 sm	28/06	02/07
82	Pose des portes	4 sm	14/10	15/11
83	Pose des placards techniques	4 sm	15/07	01/09
84	Pose des plinthes	4 sm	14/10	15/11
85	Equipements	2 sm	25/01	07/02
86	Agencement / placards / stores	2 sm	08/02	21/02
87	Signalétique	2 j	22/02	23/02
88	**Cloisons, doublages, plafonds placo**	**85 j**	**24/05**	**13/10**
89	Aérobloc	4 sm	24/05	18/06
90	Isolation / étanchéité à l'air / plafond sous charpente	6 sm	07/06	21/07
91	Cloison doublage	12 sm	28/06	13/10
92	Enduits plâtre	6 sm	21/06	25/08
93	**Revêtement de sol**	**110 j**	**23/09**	**28/02**
94	Chapes	6 sm	21/10	06/12
95	Etanchéité sous faïence	4 sm	23/09	20/10
96	Etanchéité sous carrelage	4 sm	07/12	03/01
97	Faïence	6 sm	21/10	06/12
98	Ragréage	4 sm	07/12	03/01
99	Carrelage	6 sm	14/12	24/01
100	Sols souples	6 sm	04/01	14/02
101	Pose des miroirs	2 sm	15/02	28/02
102	**Peinture**	**164 j**	**16/09**	**05/05**
103	Préparation peinture	10 sm	16/09	29/11
104	Peinture	10 sm	16/11	24/01
105	Finitions	2 sm	25/01	07/02
106	Nettoyage avant réception	2 sm	08/02	21/02
107	Nettoyage avant remise au MOA	2 sm	24/04	05/05
108	**Ascenseur**	**275 j**	**04/01**	**21/02**
109	Fourniture du crochet de levage	1 sm	04/01	08/01
110	Pose de l'ascenseur	2 sm	14/10	27/10
111	Mise en service	1 sm	15/02	21/02
112	**Plomberie chauffage VMC**	**380 j**	**22/07**	**13/03**
113	Incorporations	5 ms	22/07	15/01
114	Colonnes	6 sm	03/05	11/06
115	Passage des réseaux plomb / VMC	12 sm	28/06	13/10
116	Mise en place des BEC thermodynamiques	6 sm	16/11	27/12
117	Mise en place des bacs à douche	6 sm	30/09	15/11
118	Pose des centrales	3 sm	14/06	02/07
119	Pose des bouches de ventilations	4 sm	11/01	07/02
120	Equipement plomberie	6 sm	04/01	14/02
121	Essais et mise en service	4 sm	15/02	13/03
122	**Electricité**	**370 j**	**22/07**	**28/02**
123	Incorporations	5 sm	22/07	15/09
124	Colonnes	6 sm	03/05	11/06
125	Passage des réseaux	12 sm	28/06	13/10
126	Tableaux électriques, baie VDI	8 sm	14/10	13/12
127	Pose des radiateurs	6 sm	21/12	31/01
128	Equipements	5 sm	04/01	07/02
129	Consuels	1 sm	08/02	14/02
130	Essais et mise en service	3 sm	08/02	28/02
131	Eclairage extérieur	2 sm	28/12	10/01
132	Intempéries prévisibles	10 j	14/03	27/03
133	OPR	0 j	27/03	27/03
134	Levées des réserves	19 j	28/03	21/04
135	Réception de chantier	0 j	21/04	21/04
