SECURISATION DU JARDIN DES HEROS

Commune de la Bollene Vésubie

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Préparation de chantier**	**20 jours**
2	OS de démarrage période de préparation de chantier	1 jour
3	Démarches admistratives (DICT, Dérogations, constat d'huissier etc.)	3 semaines
4	Rédaction des documents préparatoires (demandes d'agrément, procédures d'exécution, PAQ, PPSPS, etc.)	2 semaines
5	Etude d'exécution (mission G3)	3 semaines
6	Commande des fournitures	1 semaine
7	**Exécution des travaux**	**100 jours**
8	OS de démarrage des travaux	1 jour
9	**Traitement de la zone centrale éboulée**	**81 jours**
10	Installation du chantier, amenée du matériel, mise en place de l'aternat sur RM70	1 jour
11	Mise en sécurité provisoire du chantier et des enjeux, et protection des avoisinants, dépose de l'éclairage publics, découpe et retrait de la poutre de couronnement	2 jours
12	Terrassement par passe, réalisation des ancrages et gunitage de la paroi provisoire yc compris démontage soignée des jonctions à l'avancement	35 jours
13	Micropieux de fondation	8 jours
14	Réalisation de la semelle de fondation	4 jours
15	Rallongement des ancrages et réalisation du coffrage perdu de la paroi définitive	5 jours
16	Coffrage des rives, ferraillage, mise en place du drainage et barbacanes, bétonnage par projection voie sèche de la paroi définitive	10 jours
17	Remblaiement arrière en ballast 20/40mm	1 jour
18	Réfection du parement à l'identique avec pierre du site recalibrée	15 jours
19	**Traitement des joues latérales**	**12 jours**
20	Carottages prealables aux forages et barbacanes	5 jours
21	Réalisation des ancrages et mise en place des croix de ST ANDRE	12 jours
22	**Travaux de finition**	**7 jours**
23	Réalisation de la poutre de couronnement	5 jours
24	Mise en place des gardes corps	1 jour
25	Remblais et nivellement du square	1 jour
26	Reprise de la chaussée d'accès à la piscine en enrobé à chaud	2 jours

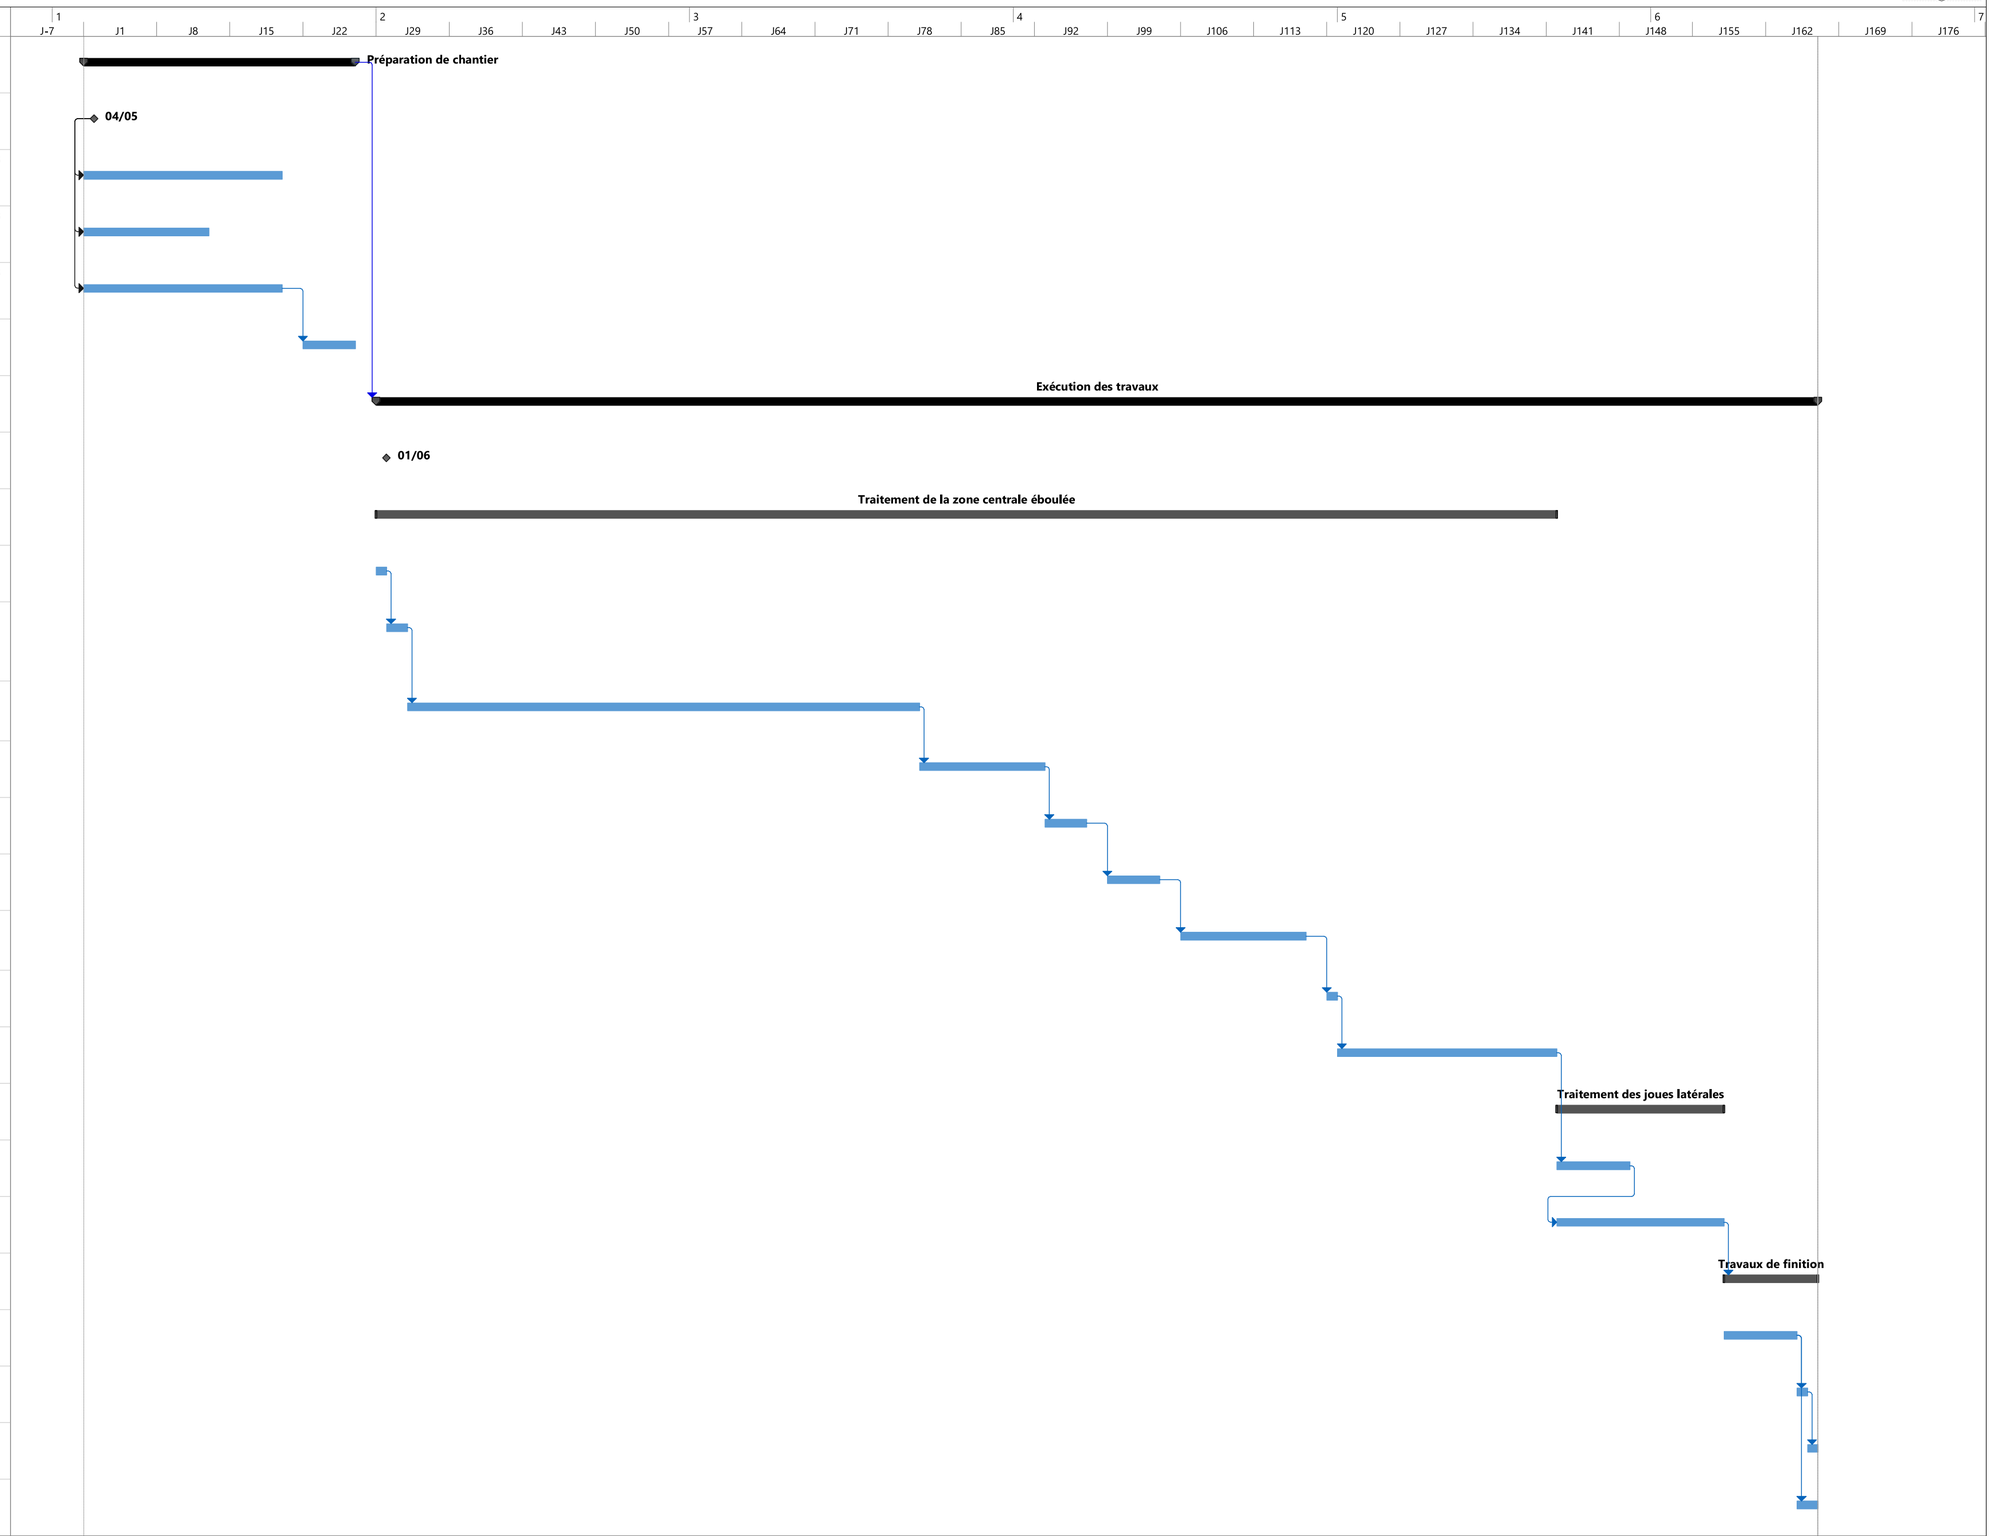

PLANNING DCE
