N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Démantelement existant (hors scope)**	**1160 j?**	**Lun 18/08/25**	**Ven 25/01/30**
2	Démantelement chaudière et panoplie	40 j	Lun 10/11/25	Ven 02/01/26
3	Démantelement chaudière et panoplie	40 j	Lun 05/01/26	Ven 27/02/26
4	Démentelement pompes réseaux et collecteur	40 j	Lun 20/04/26	Ven 12/06/26
5	Démentelement câbles G1/G2	20 j	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26
6	Démantelement chaudières et panoplie	40 j	Lun 30/11/26	Ven 22/01/27
7	Démantelement chaudières et panoplie	15 j	Mar 07/07/26	Lun 27/07/26
8	**Travaux démentelement/adaptation phase 1**	**71 j?**	**Lun 08/09/25**	**Lun 15/12/25**
9	Répertorier l'ensemble des câbles de la	20 j	Lun 08/09/25	Ven 03/10/25
10	Etude de dévoiement au dessus de	10 j	Lun 06/10/25	Ven 17/10/25
11	Démentelement G3/G4 et dévoiement des	25 j	Mar 11/11/25	Lun 15/12/25
12	**Travaux cogénération**	**195 j**	**Lun 04/05/26**	**Ven 29/01/27**
13	Adaptation instrumentation cogé HP -> BP	25 j	Lun 04/05/26	Ven 05/06/26
14	Adaptation supervision cogé HP -> BP	25 j	Lun 04/05/26	Ven 05/06/26
15	Fonctionnement cogénération	65 j	Lun 02/11/26	Ven 29/01/27
16	**Travaux hydraulique phase 1**	**265 j**	**Lun 18/08/25**	**Ven 21/08/26**
17	Mise en places de vannes sur chaque	5 j	Lun 18/08/25	Ven 22/08/25
18	Mise en place du GMP dans le local cogé	30 j	Lun 05/01/26	Ven 13/02/26
19	Mise en place pompes réseau et collecteur	30 j	Lun 15/06/26	Ven 24/07/26
20	Piquage futurs cuves hydroaccumulation	20 j?	Lun 27/07/26	Ven 21/08/26
21	**Travaux chaudière (hors scope)**	**990 j**	**Lun 13/04/26**	**Ven 25/01/30**
22	Mise en places des chaudières mobile	0 j	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26
23	Réception chaudière définitive G3/G4	15 j	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26
24	Réception chaudière définitive G1/G2	15 j	Lun 03/01/28	Ven 21/01/28
25	**Travaux hydraulique phase 2**	**970 j?**	**Lun 13/04/26**	**Ven 28/12/29**
26	Raccordement départ SNCF, cogé et	25 j?	Lun 08/06/26	Ven 10/07/26
27	Raccordement G3	15 j	Mar 28/07/26	Lun 17/08/26
28	Raccordement G4	15 j	Mar 18/08/26	Lun 07/09/26
29	Nouvelle bouteille gaz à installer à	20 j	Mar 08/09/26	Lun 05/10/26
30	Raccordement bouteille gaz	5 j	Mar 06/10/26	Lun 12/10/26
31	Raccordement G1	25 j	Lun 24/01/28	Ven 25/02/28
32	Raccordement G2	25 j	Lun 28/02/28	Ven 31/03/28
33	**Travaux électricité contrôle**	**146 j?**	**Lun 13/04/26**	**Lun 02/11/26**
34	Remplacement transformateur	30 j?	Lun 13/04/26	Ven 22/05/26
35	Remplacement TGBT/TBT	30 j?	Lun 13/04/26	Ven 22/05/26
36	Raccordement pompes réseaux	20 j	Lun 27/07/26	Ven 21/08/26
37	Raccordement armoires chaudières	20 j	Mar 08/09/26	Lun 05/10/26
38	Essais à blanc	5 j	Mar 06/10/26	Lun 12/10/26
39	Essais à chaud	5 j	Mar 13/10/26	Lun 19/10/26
40	Marche probatoire (avec réglages)	10 j	Mar 20/10/26	Lun 02/11/26
41	Essais et mise en service industrielle	0 j	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
42	Essais de performance	0 j	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26

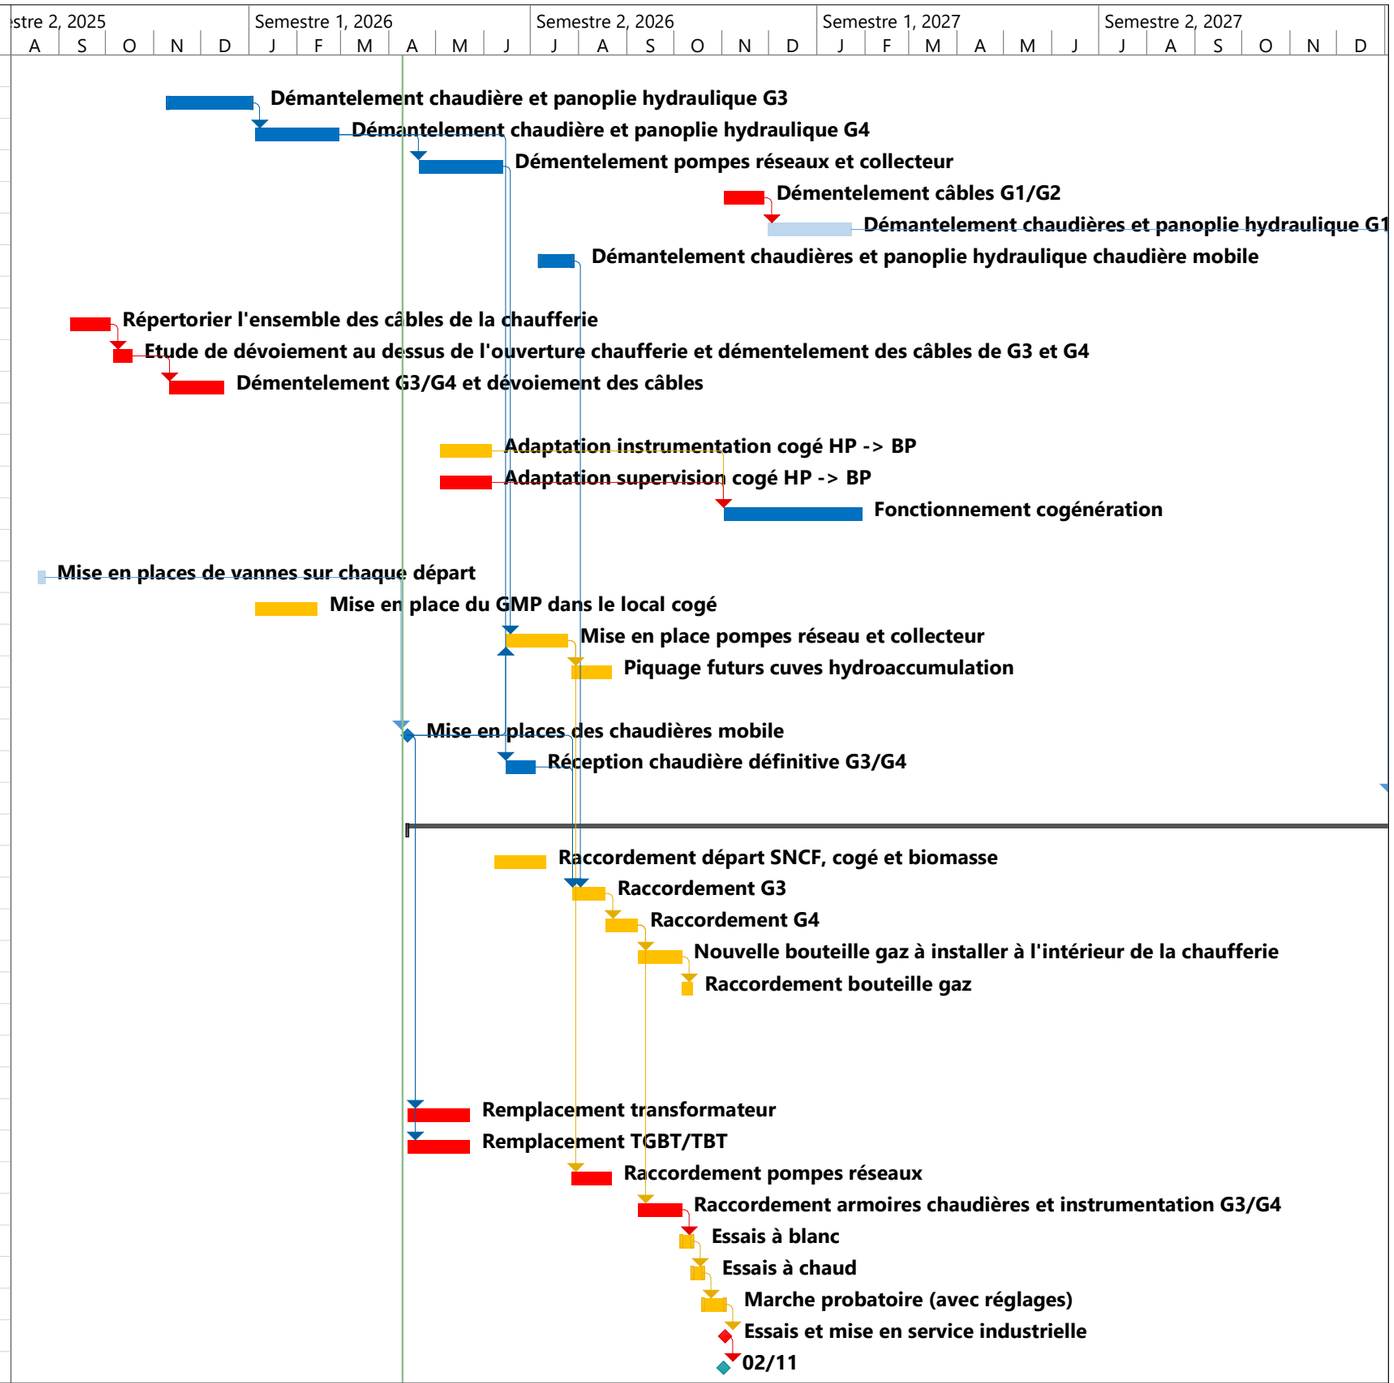

Projet : 25-IS032-1-DALKIA CH
Date : Ven 10/04/26

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	
